貳. 計畫緣起及目標

一、 計畫緣起

配合行政院道路交通安全精進作為政策推動，精進本市市區道路交通安全，期透過完善之道路交通工程改善，提升路口人車通行安全；本計畫四處路口通勤車流量高且轉向需求高，致路口易發生交通事故，為改善該路口交通安全，爰辦理打除分隔島增設左轉專用車道改善工程。

二、 計畫目標

增設左轉車道配合更設號誌管制為左轉保護時相，改善轉向車輛與直行車交織干擾造成的壅塞，減少交通事故之發生。





參. 計畫範圍

一、安南區安明路四段安中路六段路口	二、安南區安吉路一、二段本原街一、二段路口
	
三、安南區北安路三段培安路口	四、歸仁區市道 182 線台 39 線路口
	

肆. 現況資料調查

一、 道路幾何

本計畫四處路口各臨近路段道路寬度及車道配置如下表所示。

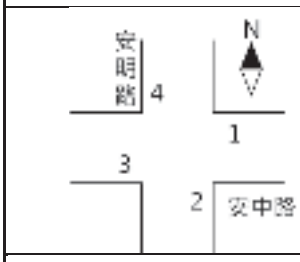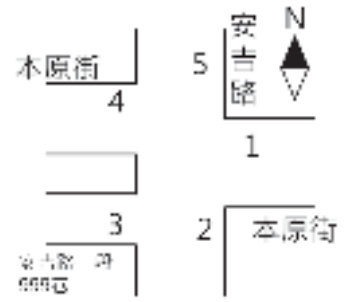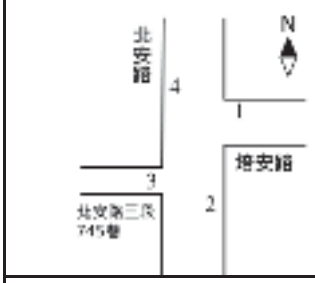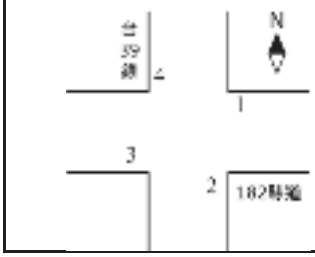
路口名	臨近路段	道路寬度（公尺）	分隔型式	車道配置（進路口方向）
	1	20	標線分隔	1 快、1 機慢
	2	30	實體分隔	2 快、1 機慢
	3	16	標線分隔	1 混、1 機慢
	4	30	實體分隔	2 快、1 機慢
	1	10	標線分隔	1 混
	2	26	實體分隔	1 左、1 快、1 混、1 機慢
	3	8	無	1 混
	4	10	標線分隔	1 混
	5	26	實體分隔	1 快、1 混、1 機慢
	1	16	標線分隔	1 混
	2	26	實體分隔	1 快、1 混、1 機慢
	3	12	無	1 混
	4	28	實體分隔	1 快、1 混、1 機慢
	1	24	實體分隔	1 快、1 混
	2	46	實體分隔	1 左、2 快、1 慢
	3	20	實體分隔	1 快、1 混
	4	46	實體分隔	1 左、2 快、1 慢


二、 肇事情形


透過「交通部道安資訊平台」分析本計畫四處路口 108~110 年 A1+A2 事故之主要肇因及碰撞類型，並繪製碰撞構圖，用以分析本計畫四處路口肇事影響因子。

1. 安明路四段安中路六段路口

經分析，本路口主要肇因為未依規定讓車及未注意車前狀況，而事故碰撞類型為車與車側撞，由碰撞構圖可看見事故發生之原因除**駕駛人違反號誌管制或指揮及未依交通規範行駛**，其中一起事故為貨車左轉造成小客車及機車追撞之事故；因本路口目前已設置左轉保護時相，惟受限於道路寬度現況並未設置左轉專用道，因此內車道常有左轉車與直行車停等相互阻擋問題，除了造成左轉車流紓解效率不佳，如用路人不耐久候，亦將提高事故發生率，希冀透過增設左轉專用道以提高既有左轉保護時相織紓解效率，以降低事故發生。

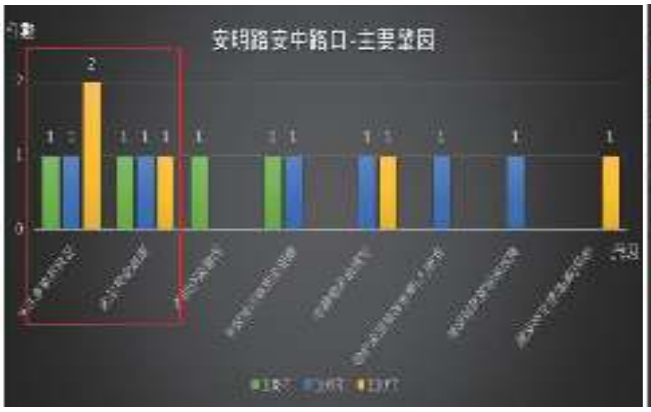

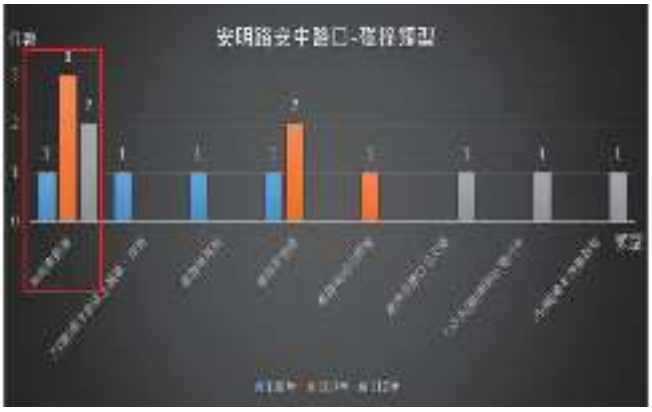


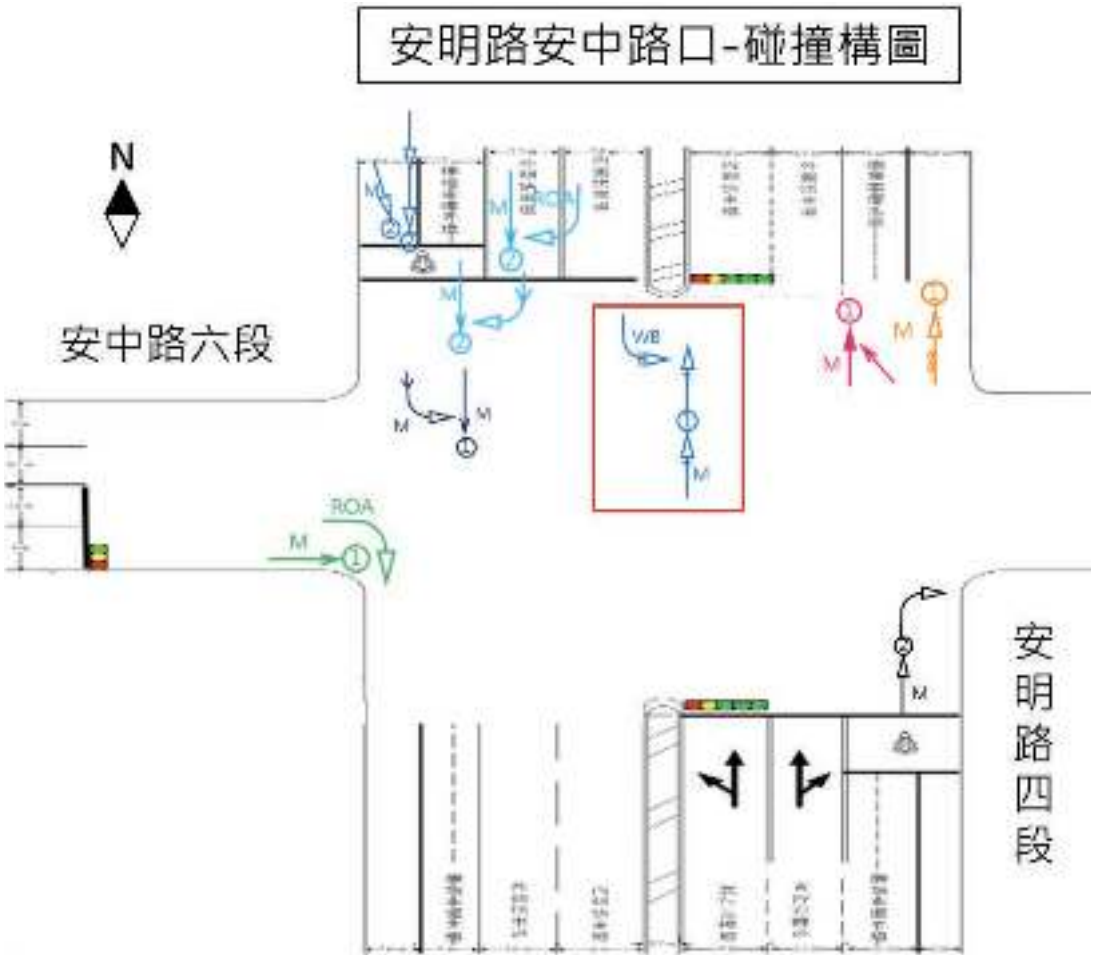



2.安吉路一、二段本原街一、二段路口

經分析，本路口主要肇因為**未依規定讓車、右轉彎未依規定**及**違反號誌管制或指揮**，而事故碰撞類型為**車與車側撞、車與車路口交叉撞**及**車與車同向擦撞**；由碰撞構圖可看見事故發生之原因大多來自駕駛人違規行為(右轉車未禮讓直行車或未依照路口號誌行駛)。

其中有三起為安吉路二段南向左轉車與安吉路一段北向直行車之碰撞事故，安吉路一段北向已設有左轉專用道及左轉時相，故未發生安吉路一段北向左轉車與安吉路二段南向直行車之事故；而安吉路二段南向未設置左轉專用道及左轉時相，安吉路二段南向左轉車僅能利用黃燈或全紅時間通過，亦可能有闖紅燈、左轉車未禮讓直行車等違反交通管制之情形發生，將提高事故發生率；希冀透過增設安吉路二段南向左轉專用道及配合更設安吉路二段與安吉路一段號誌管制為左轉保護時相，改善安吉路二段左轉車流與安吉路一段直行車流交織干擾，以降低事故發生。

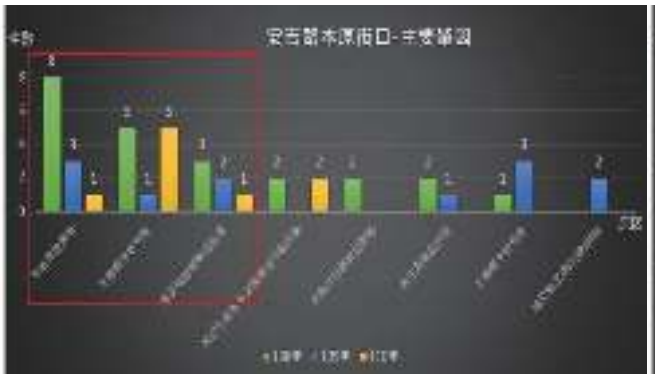

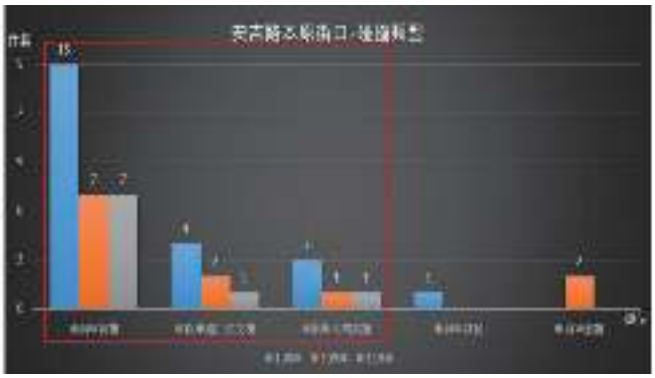


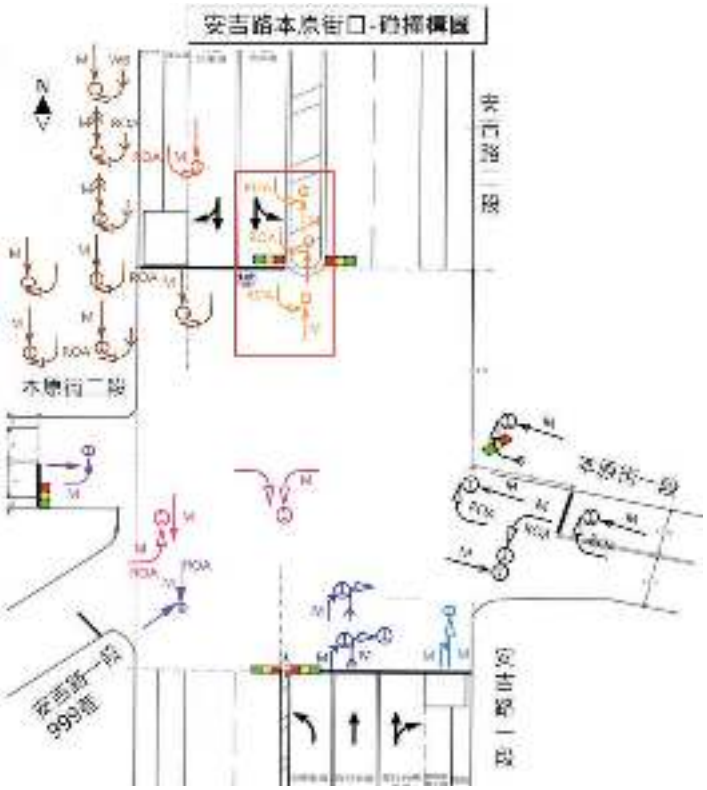



3. 北安路三段培安路口

經分析，本路口主要肇因為**未依規定讓車**及**左轉彎未依規定**，而事故碰撞類型為**車與車側撞**；由碰撞構圖可看見事故發生之原因大多為駕駛人違規行為所導致(未依規定讓車及左轉彎未依規定)。

其中有高達四起為北安路三段南向左轉車與北向直行車之碰撞事故，北安路三段南向未設置左轉專用道及左轉保護時相，北安路三段南向左轉車僅能利用黃燈或全紅時間通過，亦可能有闖紅燈、左轉車未禮讓直行車等違反交通管制之情形發生，將提高事故發生率；希冀透由增設北安路三段南北向左彎專用道及配合更設北安路三段號誌管制為左轉保護時相，以改善北安路三段左轉車流與直行車流之交織干擾，降低事故發生。

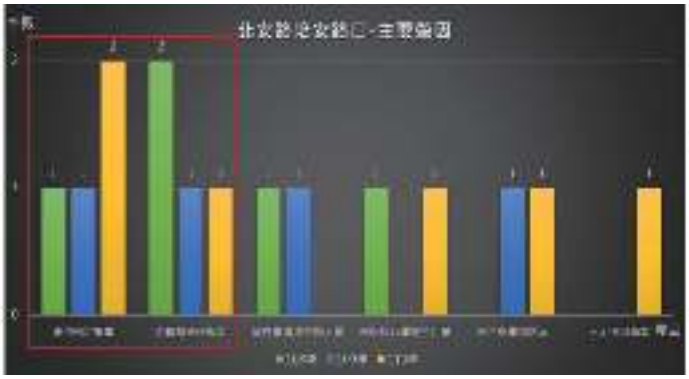

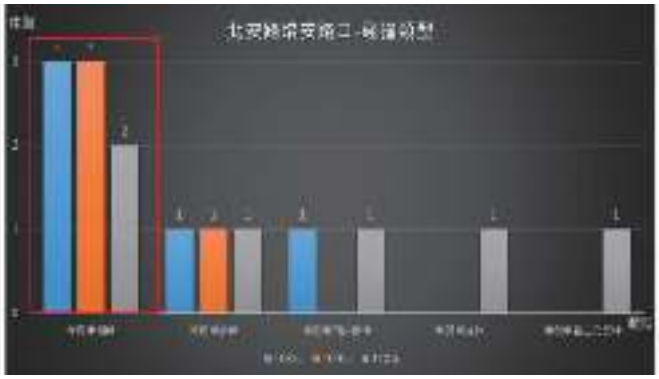


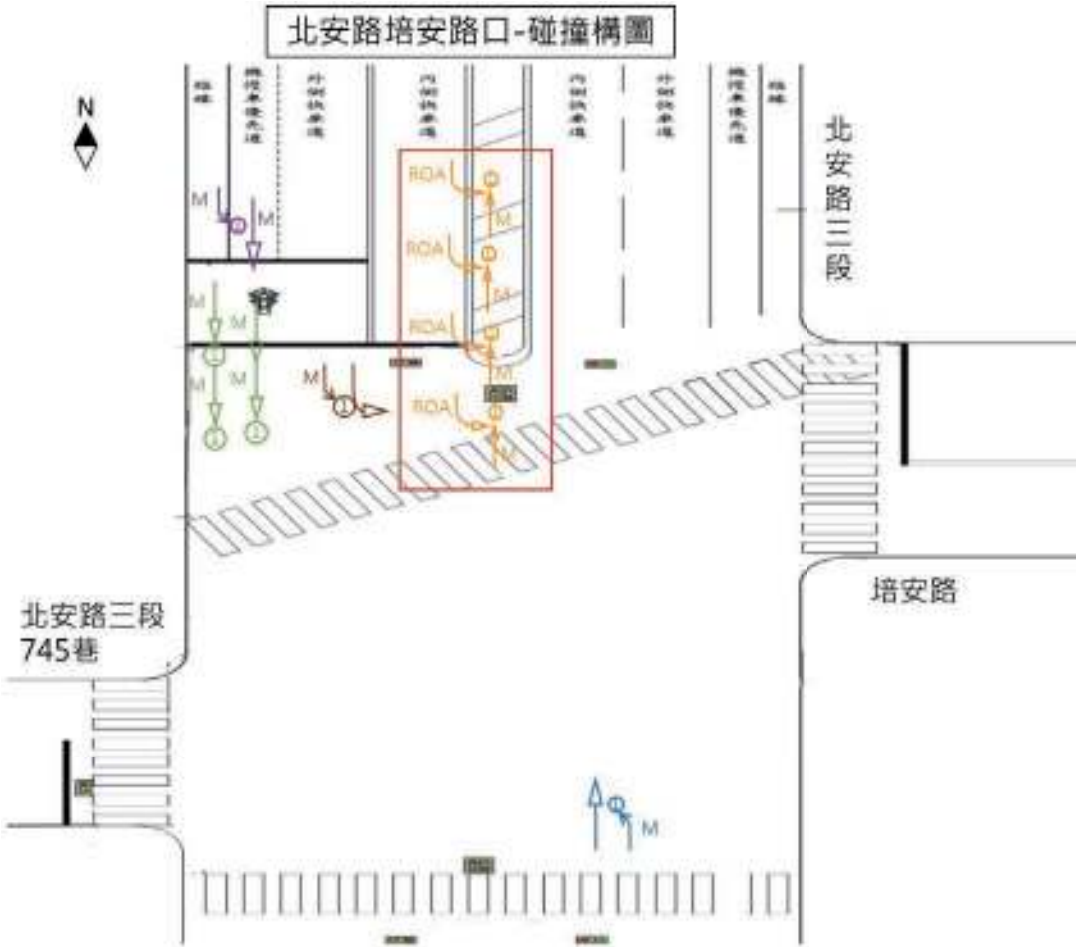


4.市道182線台39線路口

經分析，本路口主要肇因為**違反號誌管制**及**不明原因肇事**，而事故碰撞類型為**車與車側撞**及**車與車追撞**；由碰撞構圖可看見事故發生之原因大多為駕駛人違規行為所導致(違反號誌管制)。

其中有一起為市道182線東向左轉車與西向直行車之碰撞事故，市道182線雙向皆未設置左轉專用道及左轉保護時相，市道182線雙向左轉車僅能利用黃燈或全紅時間通過，亦可能有闖紅燈、左轉車未禮讓直行車等違反交通管制之情形發生，將提高事故發生率；希冀透由增設市道182線雙向左彎專用道及配合更設市道182線號誌管制為左轉保護時相，以改善市道182線左轉車流與直行車流之交織干擾，降低事故發生。

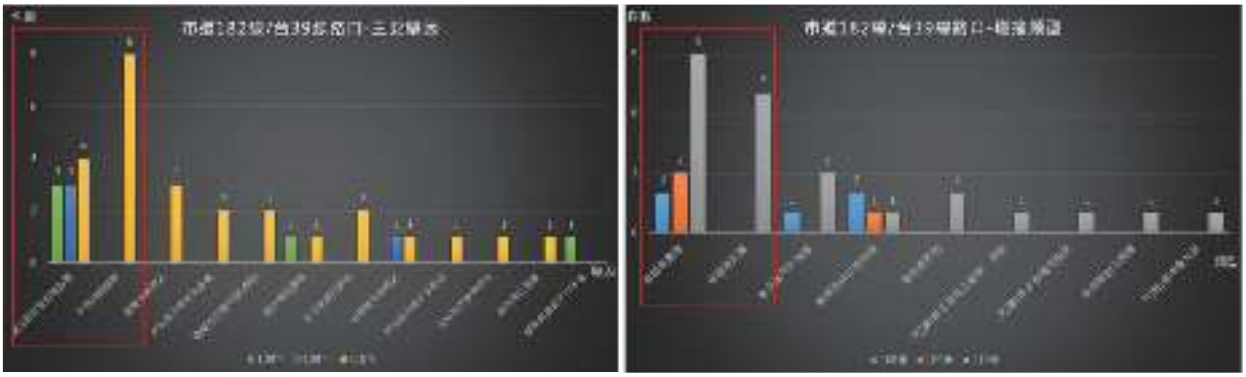

市道182線台39線路口-碰撞構圖

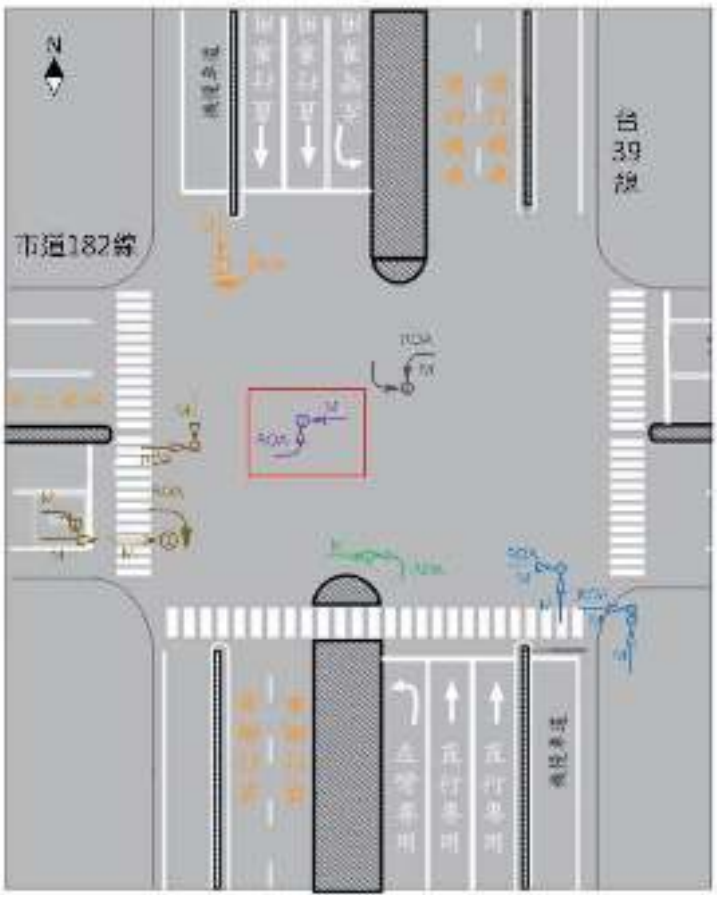

5.A1+A2 事故統計表


路 口	事故類別	108 年(件數)	109 年(件數)	110 年(件數)
安明路四段安中路六段路口	A1	0	0	0
	A2	4	6	5
安吉路一、二段本原街一、二段路口	A1	0	0	0
	A2	23	12	9
北安路三段培安路口	A1	0	0	0
	A2	5	4	6
市道 182 線台 39 線路口	A1	0	0	0
	A2	5	4	26


伍. 工程設計構想及預期效果

一、工程設計構想


為解決本計畫四處路口左轉車輛影響交通問題，研提將「**安明路四段安中路六段之安明路四段南北雙向**」、「**安吉路一、二段本原街一、二段路口之安吉路二段南向**」、「**北安路三段培安路口之北安路南北雙向**」及「**市道 182 線台 39 線路口之市道 182 線東西雙向**」之寬式中央分隔島改設為窄式分隔島，並遷移既有設施移設(如號誌桿、路燈、路樹、警局監視系統、闖紅燈照相系統等)，以增設左轉專用車道。

1.安明路四段安中路六段路口

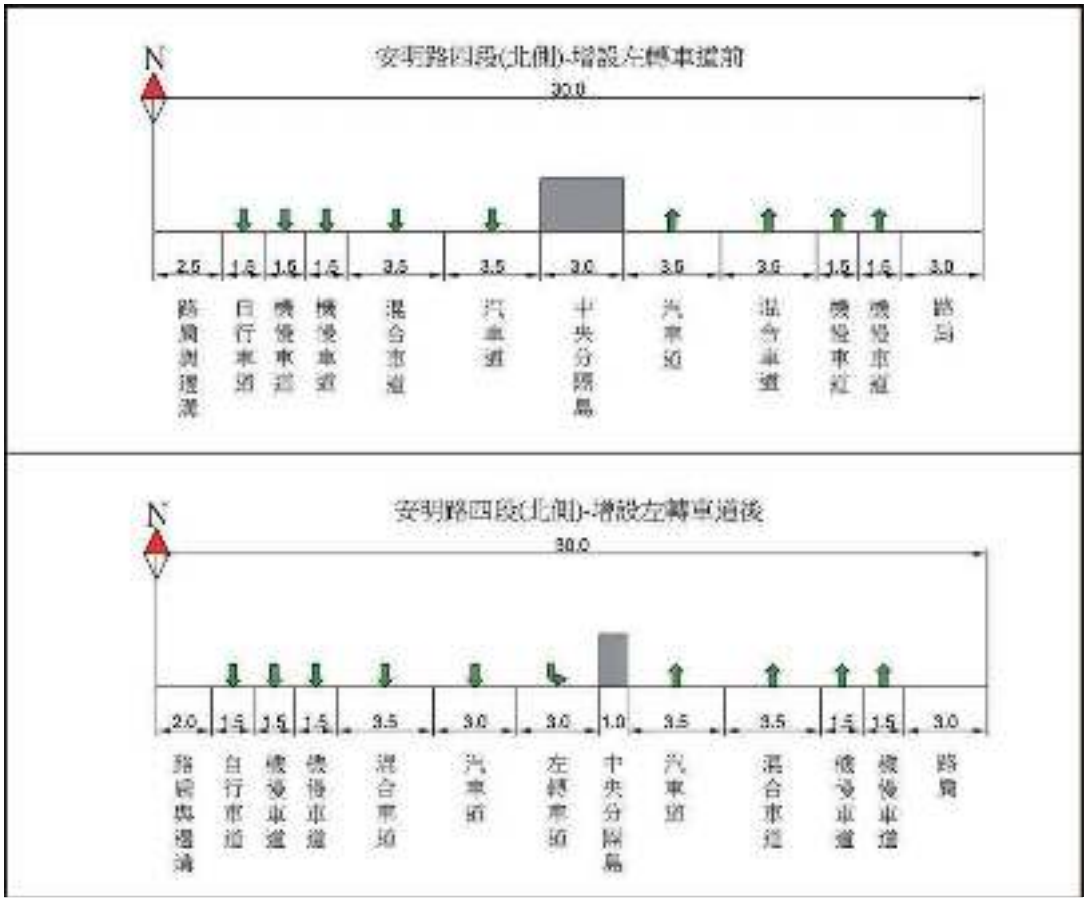


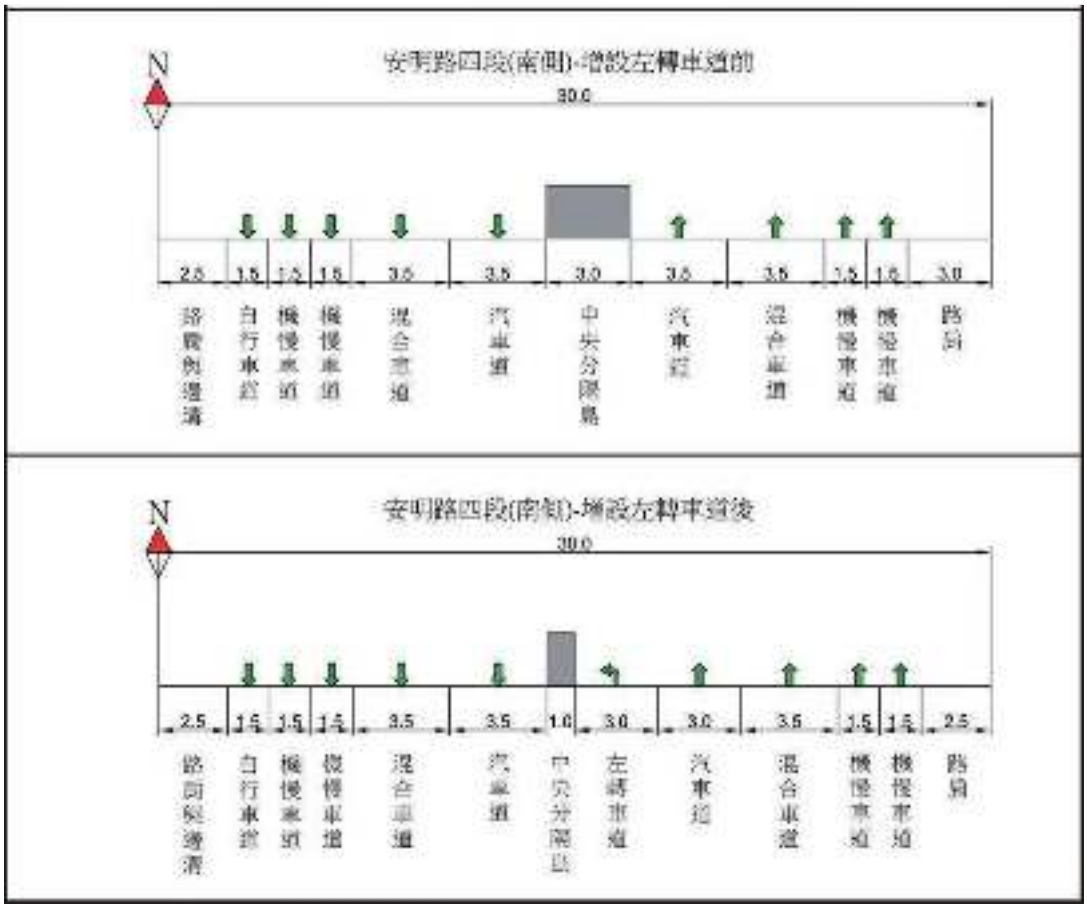

2.安吉路一、二段本原街一、二段路口

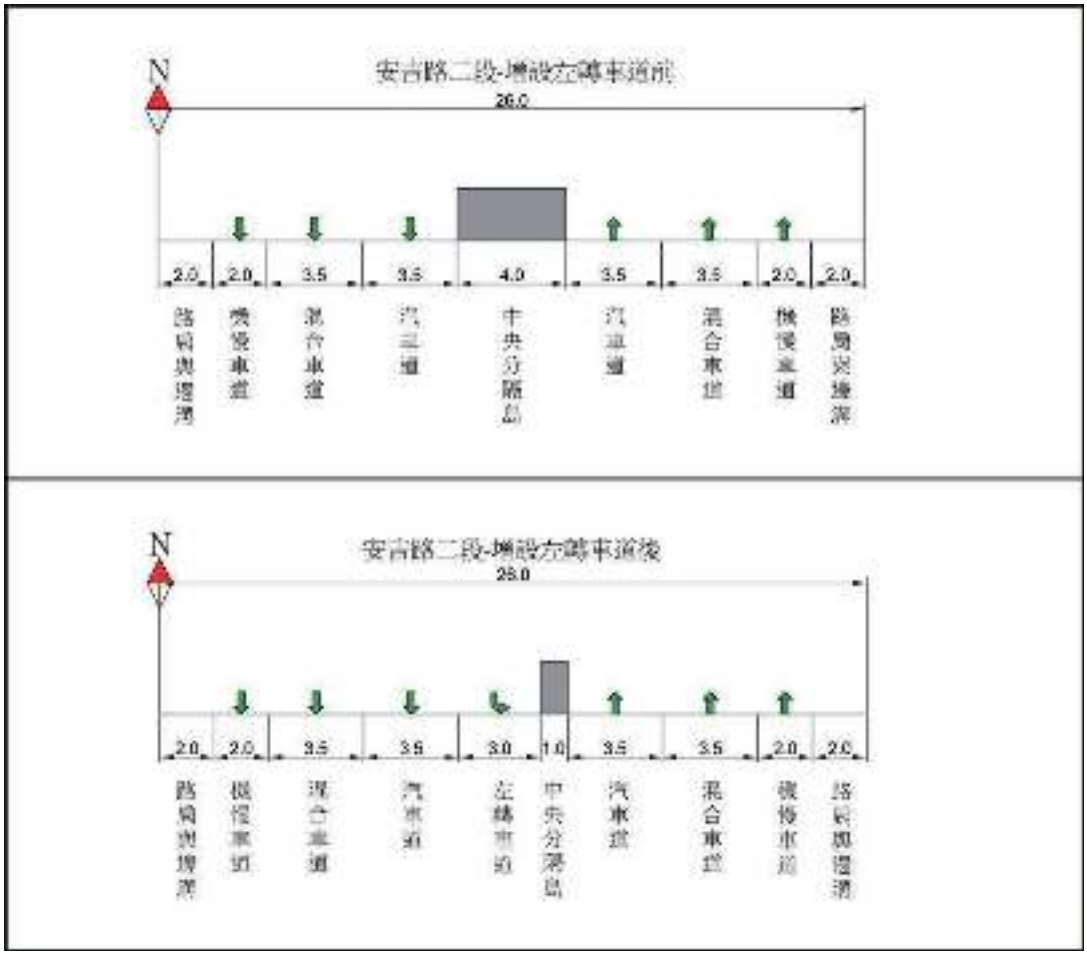

3.北安路三段培安路口

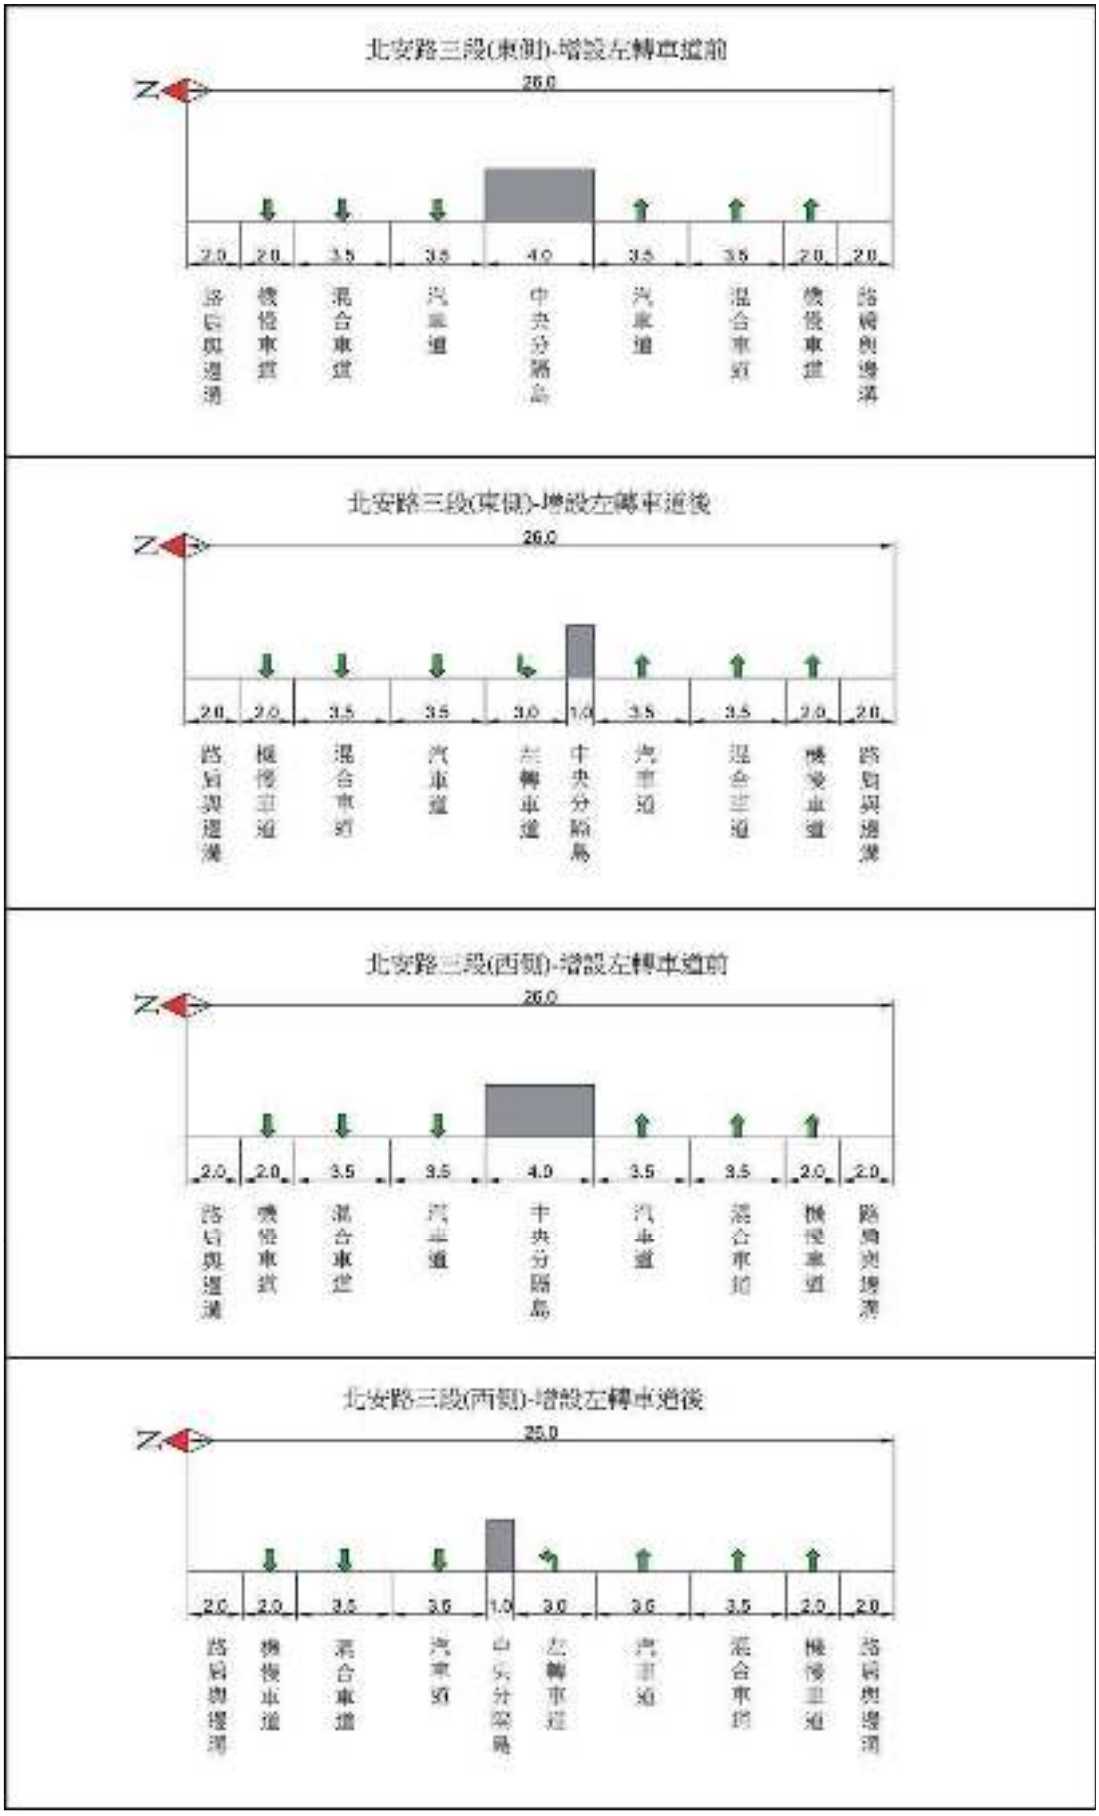
北安路三段(東側)-增設左轉車道前
26.0
2.0 2.0 3.5 3.5 4.0 3.5 3.5 2.0 2.0
路肩與邊溝 機慢車道 混合車道 汽車道 中央分隔島 汽車道 混合車道 機慢車道 路緣與邊溝
北安路三段(東側)-增設左轉車道後
26.0
2.0 2.0 3.5 3.5 3.0 1.0 3.5 3.5 2.0 2.0
路肩與邊溝 機慢車道 混合車道 汽車道 左轉車道 中央分隔島 汽車道 混合車道 機慢車道 路肩與邊溝
北安路三段(西側)-增設左轉車道前
26.0
2.0 2.0 3.5 3.5 4.0 3.5 3.5 2.0 2.0
路肩與邊溝 機慢車道 混合車道 汽車道 中央分隔島 汽車道 混合車道 機慢車道 路緣與邊溝
北安路三段(西側)-增設左轉車道後
25.0
2.0 2.0 3.5 3.5 1.0 3.0 3.5 3.5 2.0 2.0
路肩與邊溝 機慢車道 混合車道 汽車道 中央分隔島 左轉車道 汽車道 混合車道 機慢車道 路肩與邊溝

4.市道182線台39線路口

