			678.96平方公尺。
最大容納人數	100人	現有設備	1樓為玉井里、玉田里活動中心及玉井就業服務站；2樓為臺南市政府社會局玉井區社會福利服務中心。
土地所有權人	臺南市	特　　色	提供民眾休閒活動、找尋工作職缺及機關(單位)辦公及辦理活動使用。
平常使用情形	設有關懷據點及玉井、玉田里活動中心，提供里民休閒活動；設有玉井就業服務站、臺南市政府社會局玉井區社會福利服務中心，協助民眾就近找尋工作職缺及供機關(單位)辦公及辦理活動使用。		
建築物現況	■具使用執照或合法證明文件 □不具合法文件 □其他：		

六、計畫內容

（一）計畫內容：臺南市玉井區玉井玉田里活動中心耐震補強工程。

（二）工作項目：耐震補強。

七、使用管理、後續維護計畫：由玉井里及玉田里辦公處負責平時之使用管理，並向區公所通報後續之維護需求，於年度預算內支應修繕。

八、預期績效目標

（一）工作目標：依建築相關法規進行耐震補強，提供民眾安全之使用環境。

（二）量化指標：

使用情形	次/月	人/月	時/月	使用面積（平方公尺）	容納人數
現況	30次/月			678.96	100人
完工後	30次/月			678.96	100人
使用率比較%	100%				

（申請重建案，僅填列完工後之預估使用情形）

（三）效益指標：提供民眾安全無虞的使用環境及活絡里活動中心使用率。

（四）風險評估：無。

（五）環境影響評估：無。

（六）規劃方向說明（拆除重建工程需有完整規劃設計，應包括具防震、防颱等防災規劃，可確保災害發生時發揮緊急安置災民等防災功能；配合「整

建長照衛福據點計畫」之需求；融入智慧綠建築推動方案等政策理念，及兼顧不同性別、性傾向或性別認同者之權益等需求)。

九、資源需求及財務方案

十、預算說明

（一）經費來源：申請補助及自籌(自籌款由臺南市政府負擔)。

（二）支用明細：

工作項目	經費分配（新臺幣千元）	備註
臺南市玉井區玉井玉田里活動中心耐震補強工程	9,156	詳如補強方案一費用概算明細表
合　　計	9,156	

十一、辦理機關與人員：

機關	單位	姓名	職稱	電子信箱	聯絡電話
臺南市玉井區公所	民政及人文課	溫昭誠	課長	chao5741141@mail.tainan.gov.tw	06-5741141#18 06-5741125
臺南市玉井區公所	民政及人文課	楊媛莉	課員	beautymoly@mail.tainan.gov.tw	06-5741141#23

十二、附件：

(一)耐震能力評估報告書或資料

(二)現況圖（照）片、平面圖。

(三)重建者請附土地所有權狀、地籍謄本資料。

(四)申請耐震補強者，應檢附建物使用執照；村（里）廣播系統應附施作圖說。

(五)施工初步時程。

(六)自籌財務證明。

附件1：

列管公有建築耐震詳評及補強需求計畫表

申請項目	申請單位	建築物名稱	建物地址	申請金額	是否為列管公有建築物	建築物使用執照字號	總樓地板面積	初評結果	詳評結果			方案一		方案二		備註
									min Ap (XY-X-Y四向耐震能力最小值)	Ac (耐震能力需求)	CDR (耐震容量需求比) (min Ap / Ac)	補強方式摘要	金額	補強方式摘要	金額	
補強	臺南市玉井區公所	玉井、玉田里活動中心	臺南市玉井區玉井里中正路7號	$9,155,359	7140000138	(75)南工局使字第5447號	678.42	R值：53.43	0.174	0.28	0.62	擴柱補強	$9,155,359	擴柱+翼牆補強	$9,010,979	依據通風、採光及空間使用性等需求並可減少植筋品質不穩定之風險，建議採用補強方案一（擴柱補強）。

玉井玉田里活動中心
建築物耐震能力詳細評估彙整表

建築名稱		玉井玉田里活動中心
建築及結構概述		建築規模：地下 1 層；地上 2 層，總樓地板面積約 678.96m^2。 現況用途：活動中心、辦公室(B1F~2F)，建物總高度約 11.22m。
現場勘察情形		(1)柱：較無明顯之結構性裂縫，大致上尚可。 (2)梁：較無明顯之結構性裂縫，大致上尚可。 (3)牆及地坪：有些許裂縫、滲水及剝落。 (4)平頂：有些許裂縫、滲水及剝落。
混凝土材料鑽心取樣及試驗結果	取樣數	鑽心試體 9 顆。
	取樣位置	樑構件腹側混凝土拉力區。
	分析值	fc'=110.67 kgf/cm^2(1F)、fc'=132kgf/cm^2(2F) 、fc'=117.33kgf/cm^2(B1F)。
中性化及氯離子試驗	規範容許值	0.15 kg/m^3
	氯離子濃度	0.03 kg/m^3
	中性化情形	本案混凝土中性化程度試驗共計取樣 9 顆，其中有 7 顆試體中性化程度大於等於 4cm，雖目前現場可視部份尚未發現明顯之鋼筋生銹保護層膨脹突出現象。仍建議本棟建築須持續針對結構體之氯離子含量以及水泥中性化反應進行抽樣檢測，並定期油漆保養，降低中性化速率，以確保結構使用之耐久性。
掃瞄構件鋼筋數量		全棟共 18 處柱或樑
現況耐震能力評估	X 向及-X 向	0.222g　0.228g
	Y 向及-Y 向	0.174g　0.192g
耐震能力需求	啟用日期	民國 75 年
	已使用年限	38 年
	A_T需求值	0.28g
是否合乎需求		本建築物原設計 X 向耐震能力 AP=0.260g，Y 向 AP=0.173g，現況 X 向耐震能力 AP=0.222g，Y 向 AP=0.174g，原設計及現況 X、Y 向均不符合現行耐震規範要求之 AT=0.28g，故 X、Y 向均須作結構耐震補強。

結論與建議

1.本建築物原設計 X 向耐震能力 AP=0.260g，Y 向 AP=0.173g，現況 X 向耐震能力 AP=0.222g，Y 向 AP=0.174g，原設計及現況 X、Y 向均不符合現行耐震規範要求之 AT=0.28g，故 X、Y 向均須作結構耐震補強。

2.本棟針對結構耐震補強提出二個補強方案，方案一（擴柱補強）X 向耐震能力 APR1X=0.477g、Y 向 APR1Y=0.534g 及方案二（擴柱+翼牆補強）X 向耐震能力 APR2X=0.442g、Y 向 APR2Y=0.573g 其耐震能力均能符合耐震規範之要求；依據通風、採光及空間使用性等需求並可減少植筋品質不穩定之風險，建議採用補強方案一（擴柱補強）。

3.本建築物經耐震能力分析評估後得出二補強方案，方案一補強概算經費 9,155,359 元，方案二補強概算經費 9,010,979 元。

4.本建築物屋齡已逾 38 年，現況部分裂縫，仍應予以修復以維持建築物之耐久性及使用性。

5.混凝土鑽心試體抗壓強度試驗結果（詳附件八），因圖說記載原設計混凝土強度，原設計混凝土強度應為 fc' =210kgf/cm2，依據「結構混凝土施工規範」之規定：

(1)單一試體之抗壓強度須大於設計強度之 75%(即 157.5kgf/cm2)

(2)抗壓強度之平均值須大於設計強度之 85%(即 178.5 kgf/cm2)

本棟混凝土強度其中 7 顆試體不符合單一試體之抗壓強度須大於設計強度之 75%(即 157.5kgf/cm2)之規定，其中 2 組平均強度不符合設計強度之 85%(即 178.5 kgf/cm2)之規定，故本棟整體混凝土抗壓強度偏低，不符合「結構混凝土施工規範」上述規定，故提高補強量體確保本棟建築物耐震能力。

6.本建築物建議使用單位除平日目視監測外,仍持續針對氯離子含量檢測是否侵蝕鋼筋造成鋼筋膨脹擠壓混凝土而形成裂縫，並檢視全棟有無出現高氯離子反應現象，以維護房屋結構使用安全性及耐久性。

7.本標的物目前混凝土中性化深度偏高即中性化程度嚴重，可能造成鋼筋生銹保護層膨脹突出現象，須加強對混凝土之中性化現象持續追蹤觀察，並定期油漆保養阻絕混凝土接觸空氣中水氣及二氧化碳，減緩中性化速率，建議對混凝土中性化現象持續追蹤觀察，並定期油漆保養，降低中性化速率，防止鋼筋提早銹蝕。

8.現況隔間牆均已納入結構分析，建議使用單位不宜作拆除及變更。

9.建議各樓層用途須與原設計相同及不得任意增建增加樓層，避免增加額外載重，導致降低建築物耐震能力。


10.本報告所提之修復補強工程係屬原則性之規劃方案，供後續修復補強設計之參考依據。

11.上述之修復補強工程應委由相關專業技師及建築師設計監造。


臺南縣政府工務局使用執照

(85)南工局使字第 號

| | | |

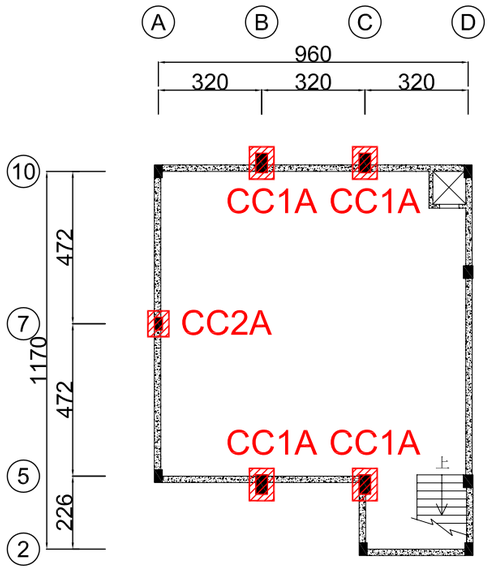

地下一層建築平面圖

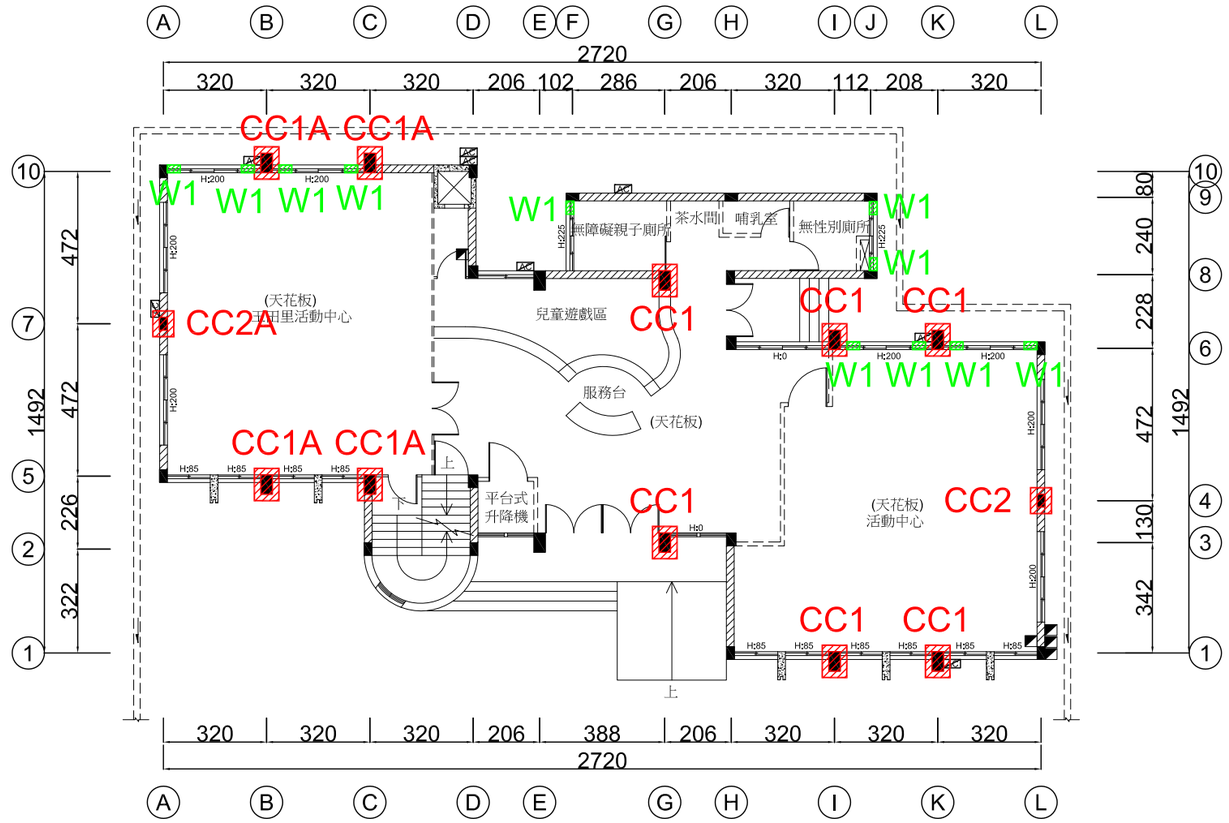



一層建築平面圖

鋼筋號數	規格
#3以上	SD420W (非水淬)
混凝土	規格
fc'	280kgf/cm²


名 稱	尺　寸
CC1、CC1A 36x60 100 76	擴柱後：76x100cm 原有柱：36x60cm (X向擴20cm) (Y向擴20cm)
CC2、CC2A 25x40 80 65	擴柱後：65x80cm 原有柱：25x40cm (X向擴20cm) (Y向擴20cm)
W1	高窗填補 1B磚翼牆 L=40cm T=24cm

補強方案一：擴柱補強工法



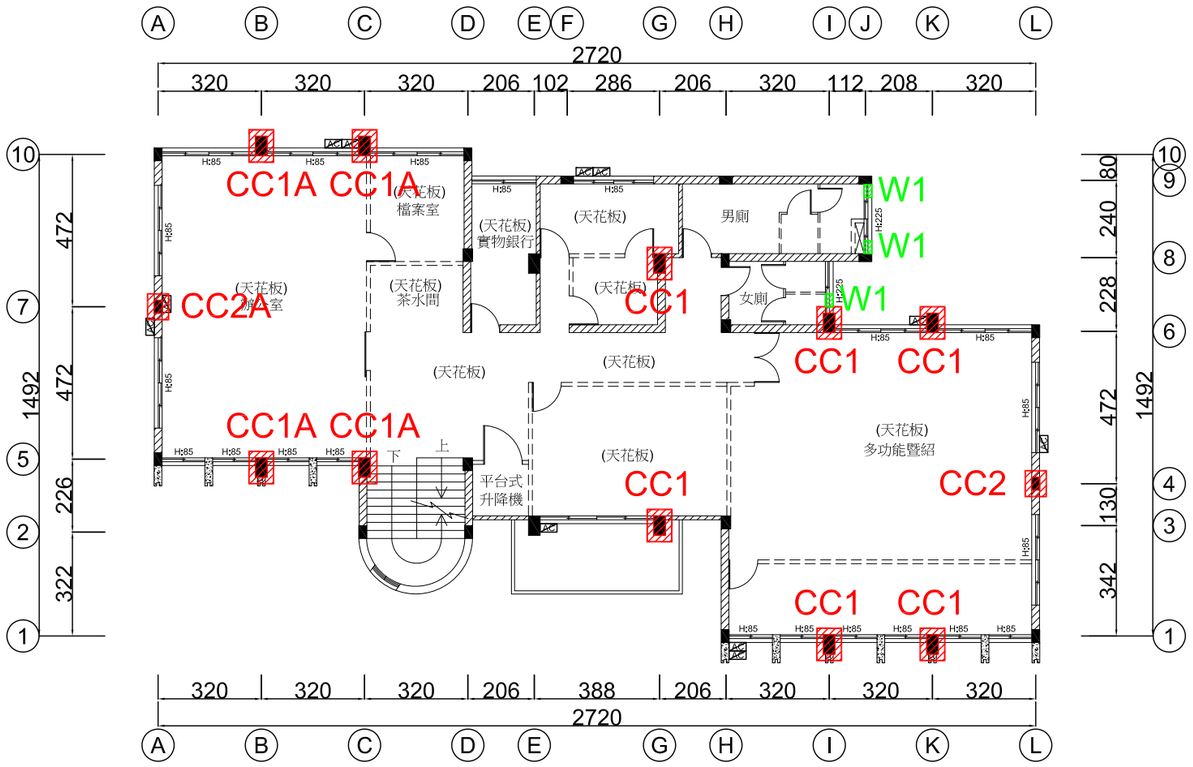

二層建築平面圖

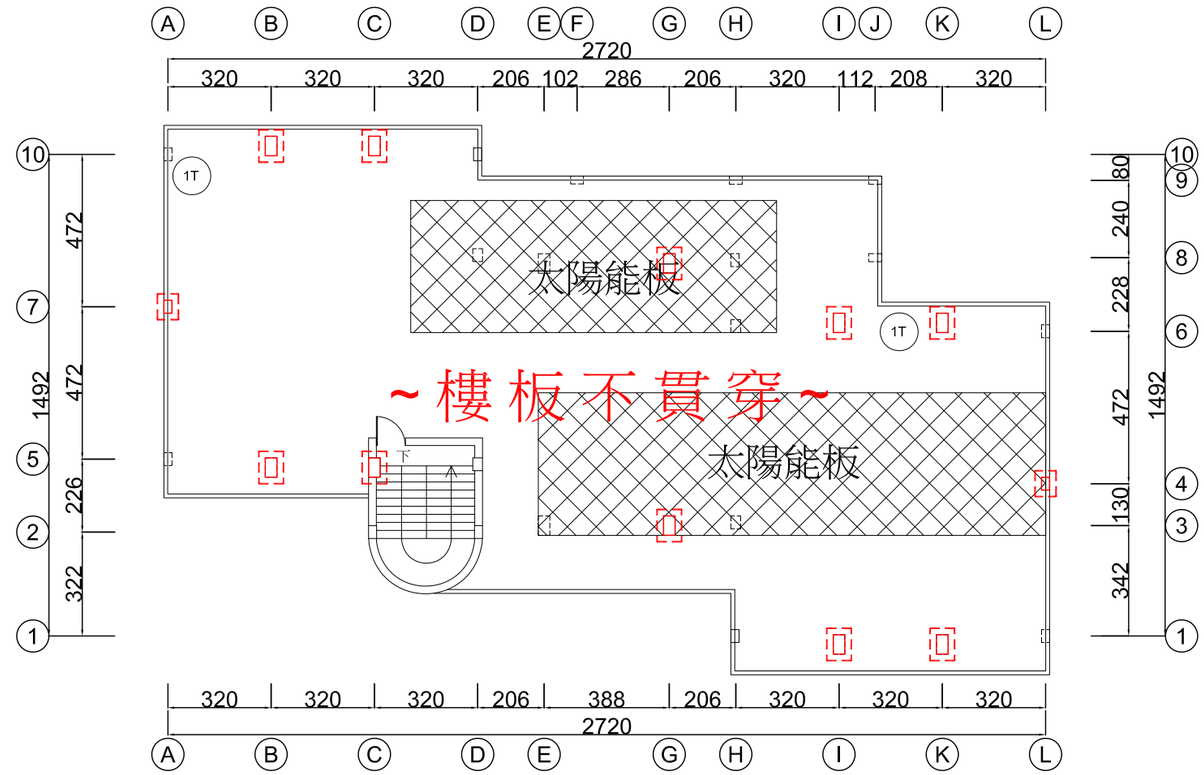


屋頂層建築平面圖

鋼筋號數	規格
#3以上	SD420W (非水淬)
混凝土	規格
fc'	280kgf/cm²

名稱	尺寸	名稱	尺寸	名稱	尺寸
CC1、CC1A 36x60 100 76	擴柱後：76x100cm 原有柱：36x60cm (X向擴20cm) (Y向擴20cm)	CC2、CC2A 25x40 80 65	擴柱後：65x80cm 原有柱：25x40cm (X向擴20cm) (Y向擴20cm)	W1	高窗填補 1B磚翼牆 L=40cm T=24cm


補強方案一：擴柱補強工法

Y
X

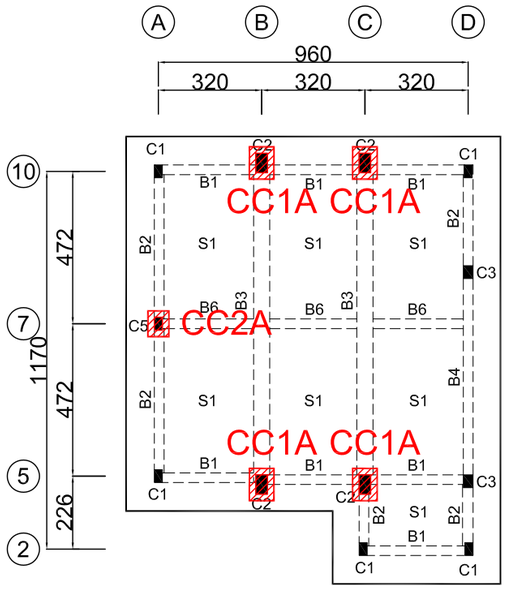

名稱	尺　寸
C1、C5	24 x 40 cm
C2	36 x 60 cm
C3	30 x 40 cm
B1、B2、B4、B6	30 x 100 cm
B3	50 x 100 cm
S1	T= 35cm

地下一層結構平面圖

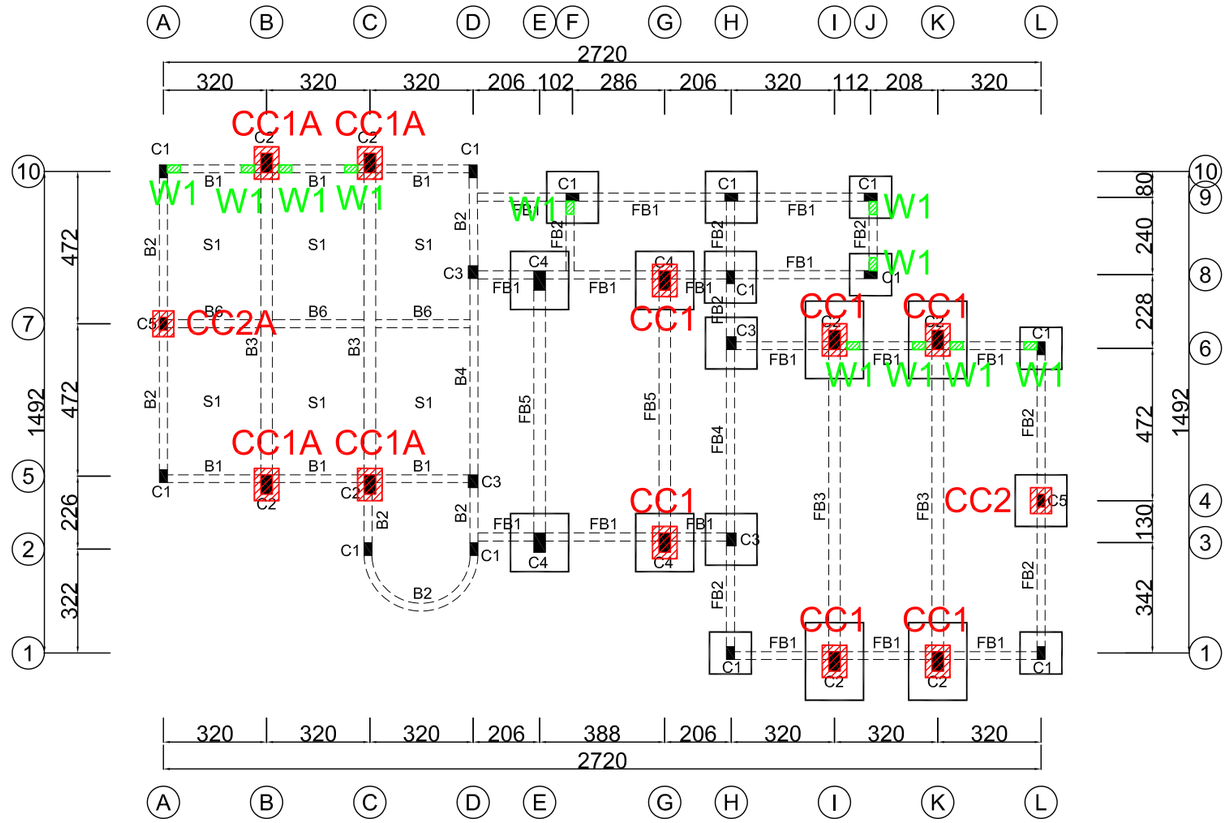

一層結構平面圖


名稱	尺　寸
C1、C5	24 x 40 cm
C2、C4	36 x 60 cm
C3	30 x 40 cm


名稱	尺　寸
B1、B2、B4	25 x 50 cm
B3	36 x 70 cm
B6	25 x 40 cm
FB1、FB2	25 x 50 cm
FB3、FB5	36 x 70 cm
S1	T= 15cm

鋼筋號數	規格
#3以上	SD420W (非水淬)
混凝土	規格
fc'	280kgf/cm²

名 稱	尺　寸	名 稱	尺　寸	名 稱	尺　寸
CC1、CC1A 36x60 100 76	擴柱後：76x100cm 原有柱：36x60cm (X向擴20cm) (Y向擴20cm)	CC2、CC2A 25x40 80 65	擴柱後：65x80cm 原有柱：25x40cm (X向擴20cm) (Y向擴20cm)	W1	高窗填補 1B磚翼牆 L=40cm T=24cm

補強方案一：擴柱補強工法




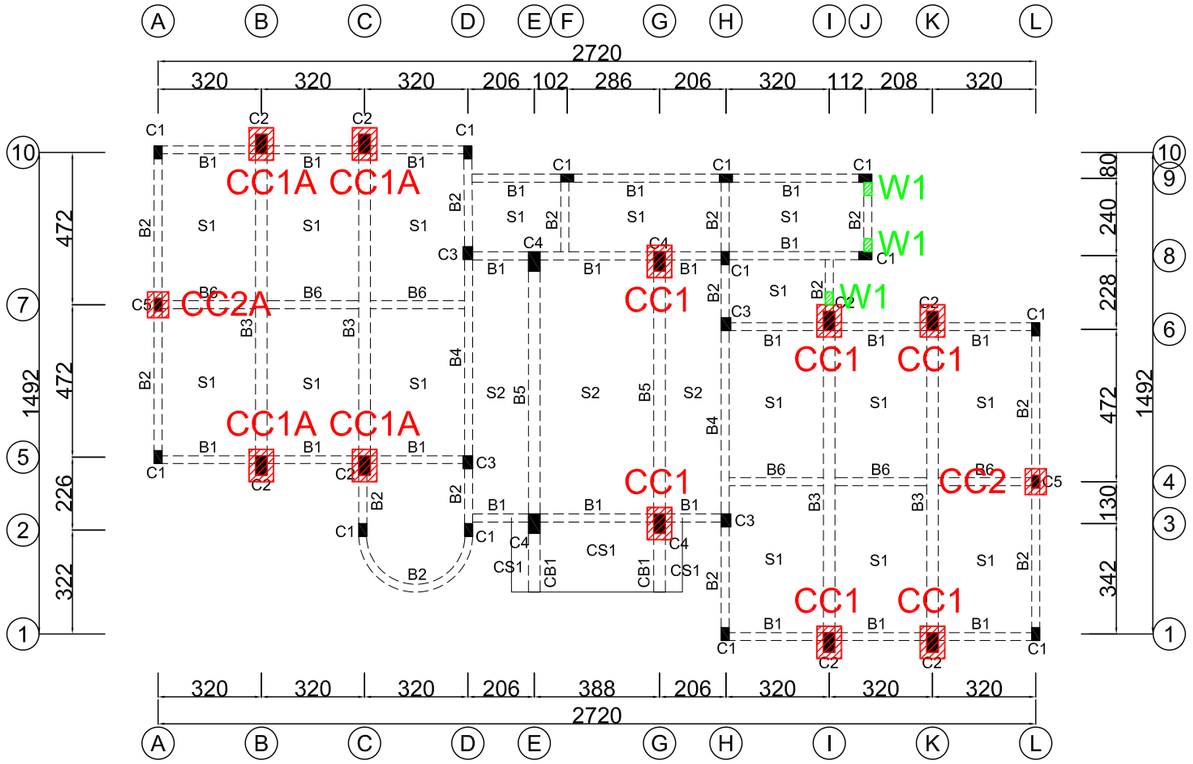

二層結構平面圖

名稱	尺　寸
C1、C5	24 x 40 cm
C2、C4	36 x 60 cm
C3	30 x 40 cm

名稱	尺　寸
B1、B2、B4	25 x 50 cm
B3、B5	36 x 70 cm
B6	25 x 40 cm
CB1	36 x 50 cm
S1、S2、CS1	T= 12cm


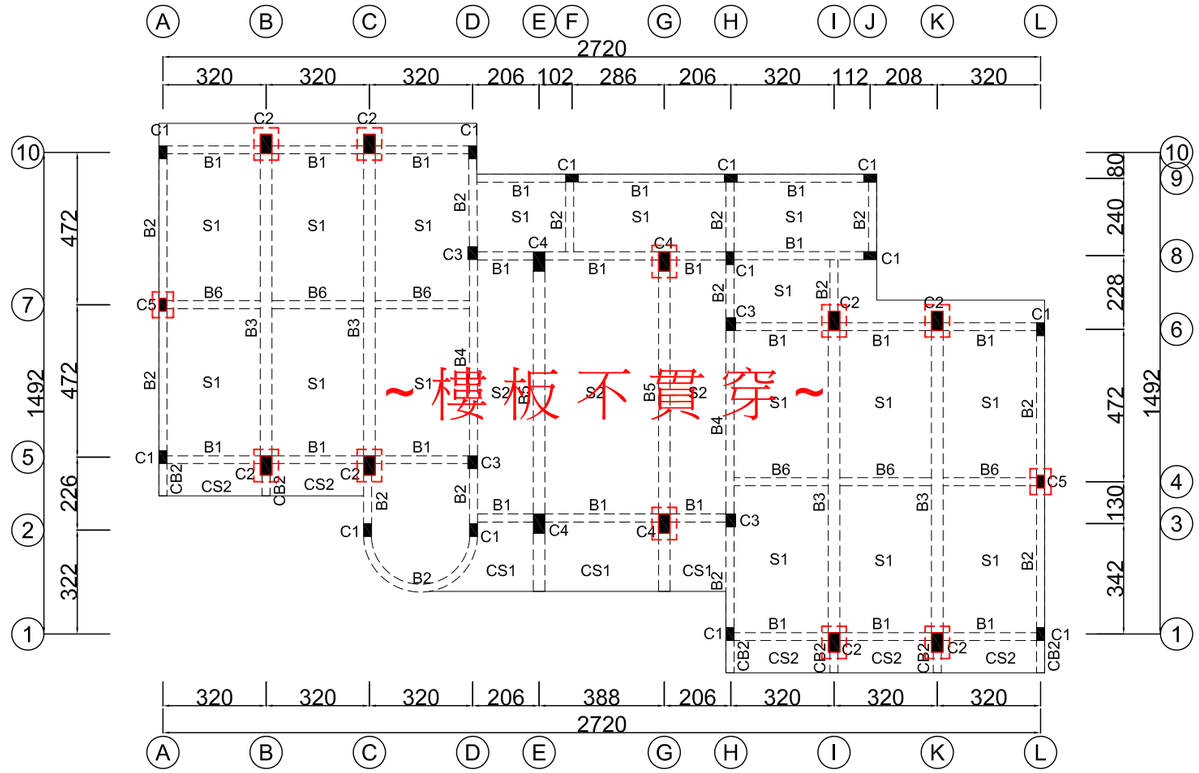


屋頂層結構平面圖

名稱	尺　寸
C1、C5	24 x 40 cm
C2、C4	36 x 60 cm
C3	30 x 40 cm

名稱	尺　寸
B1、B2、B4	25 x 50 cm
B3、B5	36 x 70 cm
B6、CB2	25 x 40 cm
CB1	36 x 50 cm
S1、S2、CS1、CS2	T= 12cm

鋼筋號數	規格
#3以上	SD420W (非水淬)
混凝土	規格
fc'	280kgf/cm²

名 稱	尺　寸
CC1、CC1A 	擴柱後：76x100cm 原有柱：36x60cm (X向擴20cm) (Y向擴20cm)
CC2、CC2A 	擴柱後：65x80cm 原有柱：25x40cm (X向擴20cm) (Y向擴20cm)
W1 	高窗填補 1B磚翼牆 L=40cm T=24cm

補強方案一：擴柱補強工法

