臺南市安平再生水廠新建工程案統包計畫-第二期（6萬噸）

- 依據行政院核定內政部「公共污水處理廠再生水推動計畫（110至115年度）第1次修正」及「臺南市安平水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫」執行。
- 預計完成安平再生水廠擴增供應再生水60,000 CMD予南科園區廠商，主要工作項目包含安平再生水廠模組擴增、輸水管線加壓站設置、安平污水下水道監測系統與延壽工程及樂利橋備援管線等相關設施興建與營運。

再生水擴增處理流程



- 前期處理流程：放流水→過濾桶→UF→1-pass RO→WAC→2-pass RO→產水
- 擴增處理流程：放流水→過濾桶→UF→1-pass RO→2-pass RO→產水

再生水/案名	115年編列經費(千元)	總經費(千元)	供應再生水量(CMD)
安平再生水廠新建工程案統包計畫-第二期	166,000	1,532,660	60,000

樂利橋備援管線工程

- 主幹管所在處難以修繕
- 建構備援管線，當主幹管系統發生損壞或淤積狀況，利用備援管線進行輸水以及修繕工作

污水下水道系統-監測系統建置工程



- 水位監測：建構污水下水道預警系統
- 水質監測：針對導電度超標處修繕
- 人孔蓋傳感器及監測設備
- 儀控系統：訊號回傳水資中心統一管理



臺南市公共污水下水道建設-虎尾寮系統

項目	說明
建設期程	(1)79~103年。 (原虎尾寮重劃區第1~3期已建置完成) (2)104~126年。 (第4~6期，目前為第5期)
管線總長度	全期：52,825m。(管徑200~1000mm) 已建設：29,758m。(完成56%)
接管戶數	全期：24,608戶。 已接管：6,577戶。(完成27%)
建設經費	全期：32.4億元。 已投入：9.3億元。(115年再編列0.81億元) (原為重劃基金建置)
目前辦理情形	虎尾寮污水分區分為管線3標、用戶接管6標及揚水站1標，共10標： (1)管線工程第1、2標，分支管第1標：已完工。 (2)分支管併用戶第1標及揚水站工程：共2標施工中。 (3)分支管併用戶第2標：細設已完成，待發包。 (4)其餘4標案陸續設計中。



虎尾寮污水下水道系統工程範圍

項次	工程名稱	115年編列經費(千元)	工程總經費(千元)	管線長度(m)		接管戶數(戶)		至114年9月進度
				設計數量	累計已完成	設計數量	累計已完成	
1	虎尾寮分支及用戶第1標	45,000	240,010	4,520	2,902	1,364	400	44.61%
2	虎尾寮揚水站工程	15,000	154,460	42	34	-	-	91.69%
3	虎尾寮分支及用戶第2標	10,000	382,537	5,087	0	2,621	0	細設完成
4	虎尾寮用戶第1標	10,000	280,818	-	-	4,726	0	細設函送國土署審查中
5	* 臺南市監測設備擴增計畫(官田、柳營、虎尾寮、仁德、永康廠)	1,000	32,470	-	-	-	-	設計中
合計		81,000	-					

臺南市公共污水下水道建設-柳營系統

項目	說明
建設期程	89~125年。（分5期，目前為第3期）
管線總長度	全期：95,650m。(管徑200~1000mm) 已建設：47,023m。(完成49%)
接管戶數	全期：23,555戶。 已接管：12,366戶。(完成52%)
建設經費	全期：57.4億元。 已投入：29.8億元。(115年再編列1.01億元)
目前辦理情形	1.東新營分區第二期：分為管線工程1標及用戶接管(併分支管網)4標，皆已完工。 2.西新營分區(國土署代辦)：分為管線工程1標及用戶接管(併分支管網)6標，共7標，分支併用戶接管工程第1標及管線第1標施工中。 3.西新營(含鹽水及交流道分區)：主次幹管第1標於114.08.19決標，餘標案設計中。



放大圖




項次	工程名稱	115年編列經費(千元)	工程總經費(千元)	管線長度(m) 設計數量	管線長度(m) 累計已完成	接管戶數(戶) 設計數量	接管戶數(戶) 累計已完成	至114年9月進度
1	西新營管線第1標【署代辦】	50,000	322,650	4,962	944	-	-	21.74%
2	西新營分支及用戶第1標【署代辦】	40,000	396,000	5,578	5,578	2,096	1,276	80.59%
3	西新營及鹽水分區主次幹管第1標【署辦】	5,850	378,790	5,338	0	-	-	114.08.19決標
4	柳營水資中心第二期擴建工程【署辦】	3,900	585,537	-	-	-	-	細設完成
5	*臺南市監測設備擴增計畫(官田、柳營、虎尾寮、仁德、永康廠)	1,000	32,470	-	-	-	-	設計中
合計		100,750	-					

臺南市公共污水下水道建設-官田系統

項目	說明
建設期程	92~119年。（分4期，目前為第3期）
管線總長度	全期：44,988m。(管徑200~700mm) 已建設：32,785m。(完成73%)
接管戶數	全期：8,450戶。 已接管：4,012戶。(完成47%)
建設經費	全期：21.8億元。 已投入：14.1億元。(115年再編列0.26億元)
目前辦理情形	1.已完成官田區第一、二期建設接管。 2.六甲分區：分為分支管併用戶接管2標，第1標施工中，第2標細設完成、待發包。

項次	工程名稱	115年編列經費(千元)	工程總經費(千元)	管線長度(m) 設計數量	管線長度(m) 累計已完成	接管戶數(戶) 設計數量	接管戶數(戶) 累計已完成	至114年9月進度
1	六甲管網及用戶第1標	15,000	393,000	6,544	6,563	1,213	1,152	95.54%
2	六甲管網及用戶第2標	10,000	193,000	3,022	0	493	0	細設完成
3	*臺南市監測設備擴增計畫(官田、柳營、虎尾寮、仁德、永康廠)	1,000	32,470	-	-	-	-	設計中
合計		26,000	-					

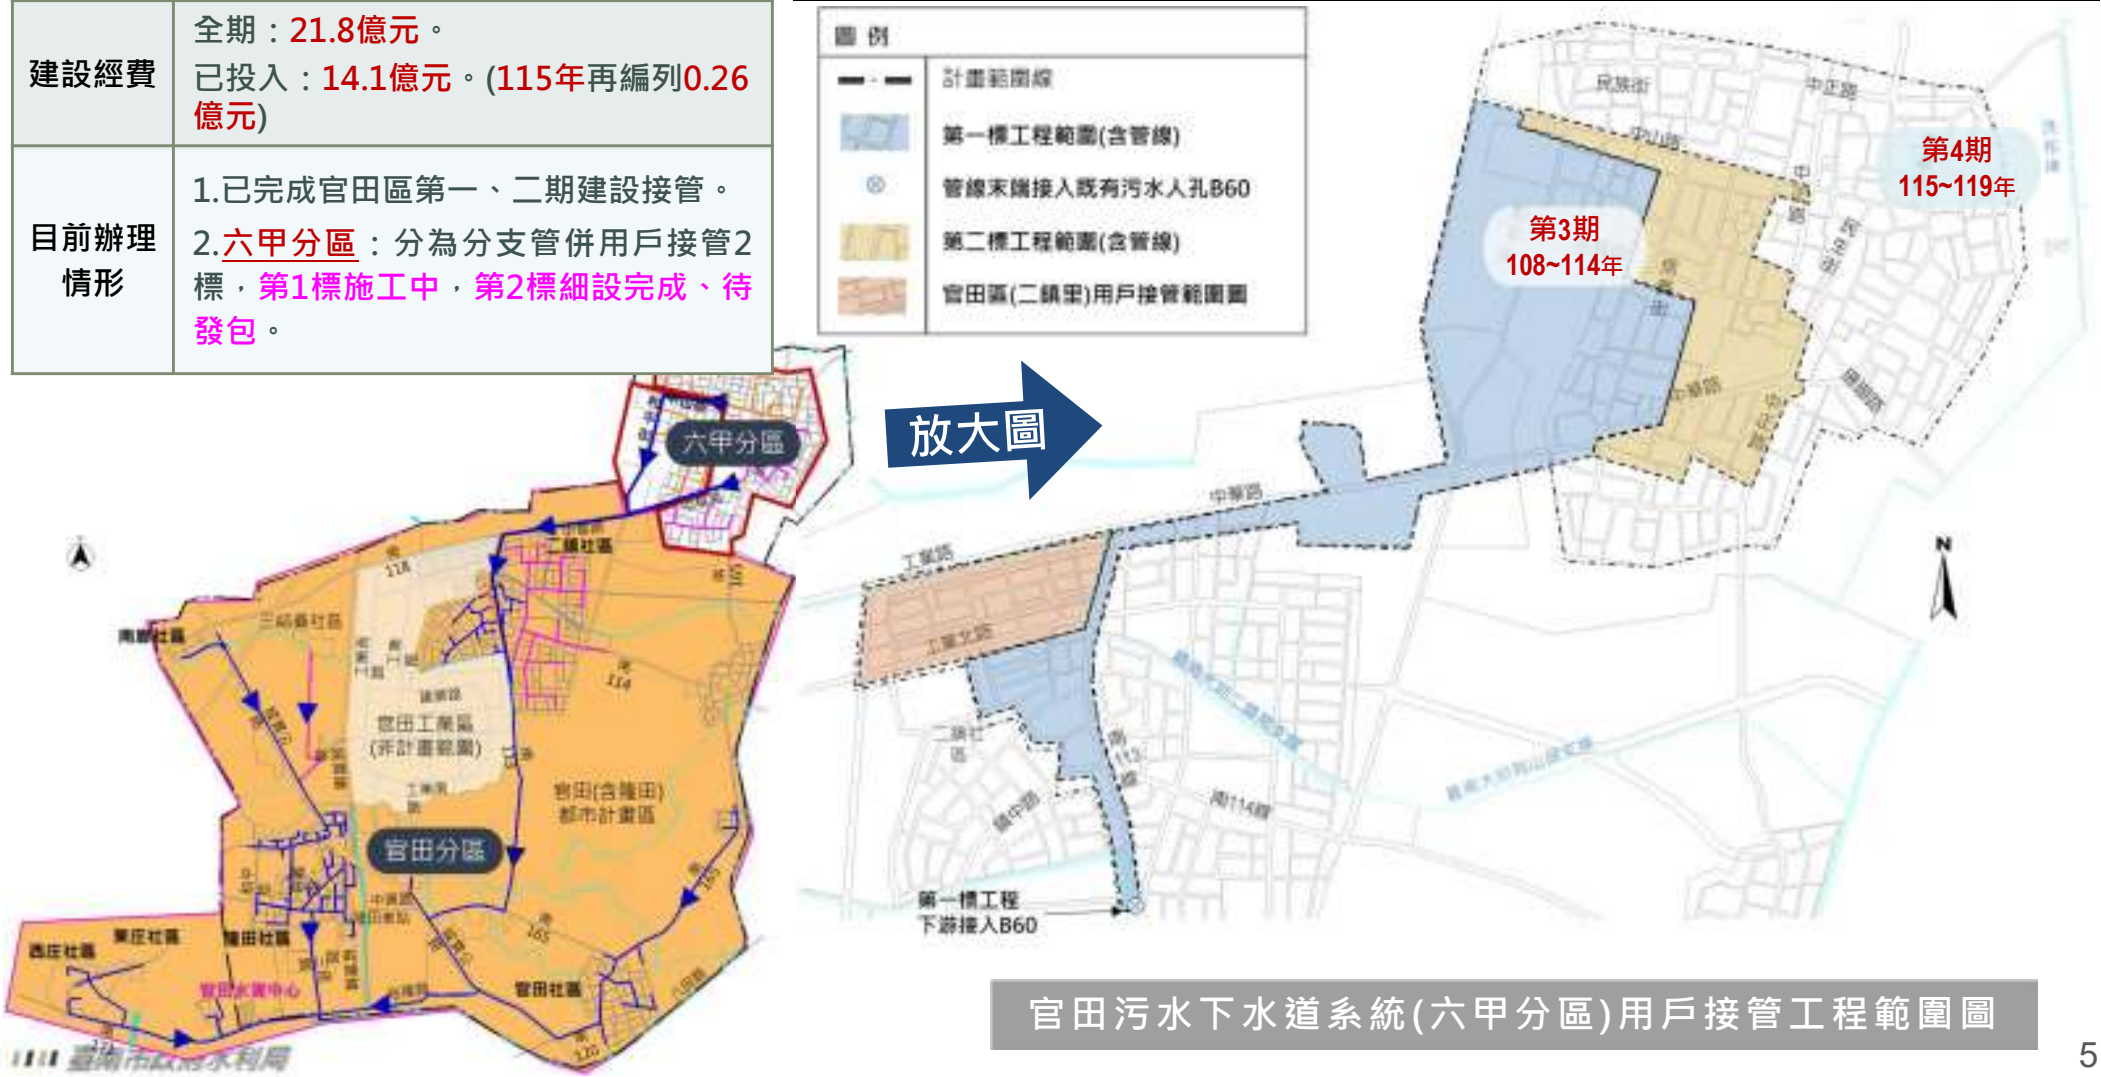

官田污水下水道系統(六甲分區)用戶接管工程範圍圖

臺南市公共污水下水道建設-仁德系統

項目	說明
建設期程	98~134年。（分5期，目前為第2期）
管線總長度	全期：177,062m。(管徑300~1200mm) 已建設：60,746m。(完成34%)
接管戶數	全期：91,188戶。(含歸仁、關廟分區25,015戶) 已接管：15,715戶。(完成17%)
建設經費	全期：175億元。(含歸仁、關廟分區45億元) 已投入：42.4億元。(115年再編列2.05億元)
目前辦理情形	1.第1期管線工程5標及用戶接管6標：皆已完工。 2.竹篙厝污水分區(東區)：目前主幹管第1標已完工，主次幹管第2、3標施工中，分支用戶第1標於114.06.16開工。 3.仁德分區第8、9、10標(原第四期)：目前第8、9標已完工，第10標施工中。



仁德污水系統全期工程範圍圖

項次	工程名稱	115年編列經費(千元)	工程總經費(千元)	管線長度(m) 設計數量	管線長度(m) 累計已完成	接管戶數(戶) 設計數量	接管戶數(戶) 累計已完成	至114年9月進度
1	仁德二期分支及用戶第10標	85,000	250,000	5,503	1,876	1,997	531	25.31%
2	仁德二期主次幹管第2標【署代辦】	40,000	357,600	1,883	2,964	-	-	79.93%
3	仁德二期主次幹管第3標【署代辦】	65,000	399,600	5,520	304	1,241	0	13.39%
4	仁德二期分支及用戶第1標【署代辦】	10,000	396,000	4,249	0	3,312	0	2.74%
5	仁德二期分支及用戶第2標【署辦】	2,496	321,900	5,282	0	2,362	0	公開閱覽完成
6	仁德二期分支及用戶第3標【署辦】	1,950	228,700	4,036	0	982	0	公開閱覽完成
7	*臺南市監測設備擴增計畫(官田、柳營、虎尾寮、仁德、永康廠)	1,000	32,470	-	-	-	-	設計中
合計		205,446	-					

臺南市公共污水下水道建設-永康系統

項目	說明
建設期程	101~122年。（分3期，目前為第2期）
管線總長度	全期：179,343m。(管徑300~1350mm) 已建設：73,436m。(完成41%)
接管戶數	全期：71,100戶。 已接管：27,221戶。(完成38%)
建設經費	全期：138億元。 已投入：52.5億元。(115年再編列2.96億元)
目前辦理情形	1.第一期：共19標，皆已完工。 2.第二期：預計分為管線併用戶接管工程共14標工程，約38,000戶。 (1)PA工程第1~3標、PB工程第1標：共4標施工中。 (2)PB工程第2標：細設已完成，待發包。 (3)其餘標案陸續設計中。




永康污水系統分期範圍圖

項次	工程名稱	115年編列經費(千元)	工程總經費(千元)	管線長度(m)		接管戶數(戶)		至114年9月進度
				設計數量	累計已完成	設計數量	累計已完成	
1	第二期PA管線及用戶第1標	80,000	340,660	4,326	2,734	2,735	634	45.85%
2	第二期PA管線及用戶第2標	75,000	395,390	5,360	1,538	1,731	370	20.79%
3	第二期PA管線及用戶第3標	75,000	370,990	5,301	228	1,850	136	10.42%
4	第二期PA管線及用戶第4標	5,000	219,870	2,940	0	1,281	0	設計中
5	第二期PB管線及用戶第1標	50,000	350,870	3,846	34	4,061	1,084	13.74%
6	第二期PB管線及用戶第2標	10,000	381,000	5,632	0	1,463	0	細設完成
7	*臺南市監測設備擴增計畫(官田、柳營、虎尾寮、仁德、永康廠)	1,000	32,470	-	-	-	-	設計中
合計		296,000	-					

臺南市永康再生水廠新建工程案統包計畫-第二期（2萬噸)


- 依據行政院核定內政部「公共污水處理廠再生水推動計畫（110至115年度）第1次修正」及「臺南市永康水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫」執行。
- 預計完成永康再生水廠擴增供應再生水20,000 CMD予南科園區廠商，主要工作項目包含永康再生水廠模組擴增、MBR產能擴增 、厭氧消化裝置設置、後脫氮單元等相關設施興建與營運。

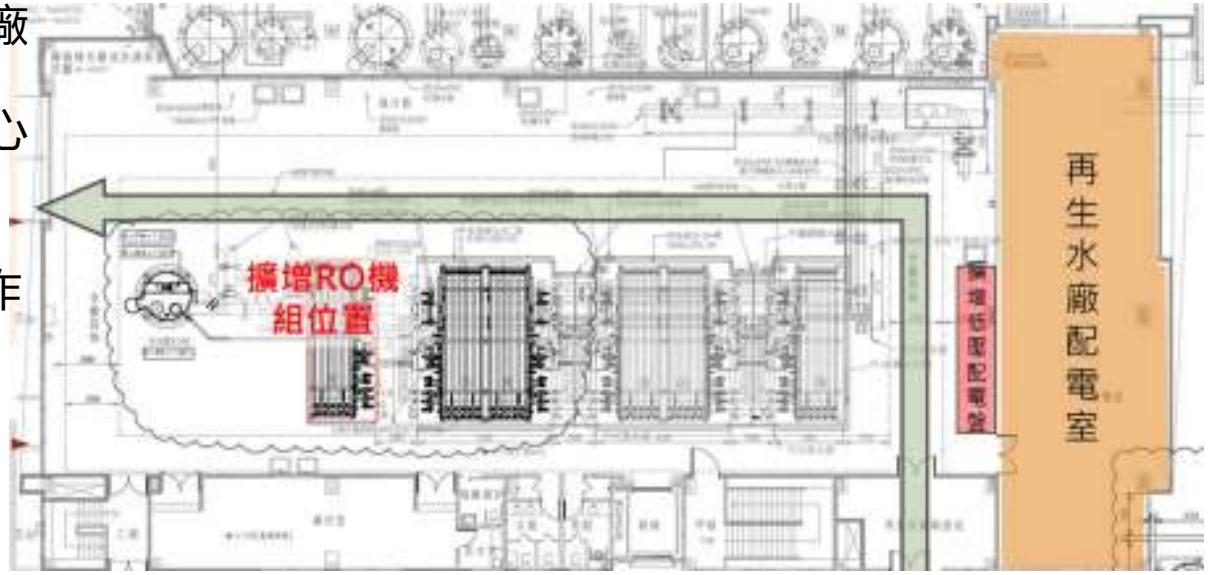

再生水/案名	115年編列經費(千元)	總經費(千元)	供應再生水量(CMD)
永康水資源回收中心及再生水廠新建工程費-第二期	50,000	508,000	20,000





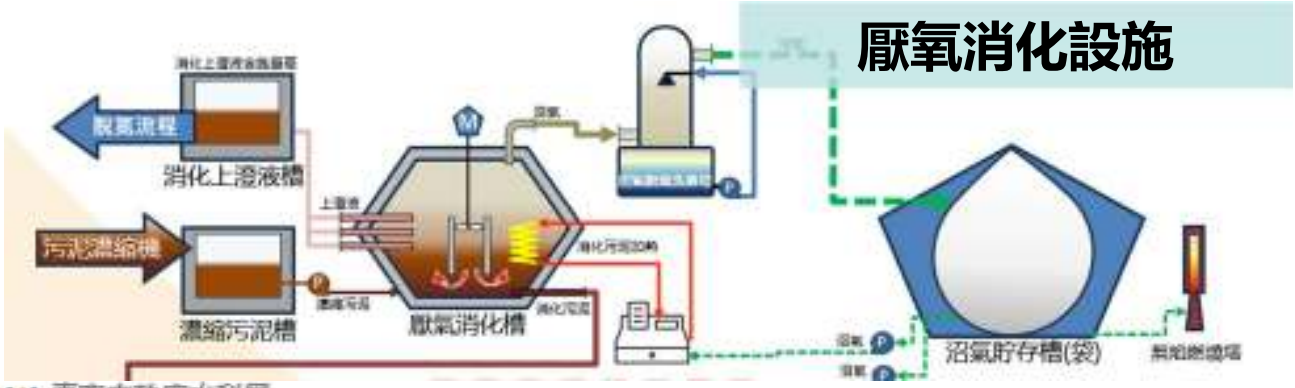



臺南市公共污水下水道建設-安南系統


項目	說明
建設期程	(1)BOT特許期間(含興建及營運期)： 102~137年。(興建期：102~116年) (2)土城分區：116~126年。（分2期）
管線 總長度	全期：175,538m(含土城分區18,978m)。 (管徑200~1200mm) 已建設：127,836m。(完成73%)
接管戶數	全期：56,427戶。(含土城分區5,427戶) 已接管：31,275戶。(完成55%)
建設經費	全期：66.7億元。(含土城分區10.4億元) 已投入：41.6億元。(115年再編列3.96億元)
目前辦理情形	1.於106年1月26日進入營運期。 2.本計畫共分四期，管網第一~三期已竣工，目前管網施作為第四期範圍，用戶接管施作為第一~三期範圍。

項次	案名	115年編列經費(千元)
1	安南區鹽水污水下水道系統促參計畫委託履約管理機構專業服務(第四期)【署辦】	240
2	安南區鹽水污水下水道系統促參計畫委託履約管理機構專業服務(第五期)【署辦】	400
3	安南區鹽水污水下水道系統促參計畫管遷、申挖、用地償金等政府應辦事項	20,000
4	安南區鹽水污水下水道系統促參計畫污水處理費	375,245
合計		395,885



臺南市公共污水下水道建設-新市系統

項目	說明
建設期程	114~137年。（分4期，目前為第1期） -水資中心：全期30,000CMD(第一期15,000CMD) -再生水廠：全期18,000CMD(第一期9,000CMD)
管線總長度	全期：53,345m。(管徑250~1000mm) (第一期預定執行：16,959m)
接管戶數	全期：47,100戶。 (第一期預定執行：2,750戶)
建設經費	全期(不含再生水系統)：85.4億元。 第一期(不含再生水系統)：29.8億元。 含再生水：全期101.2億元、第一期39.6億元。 已投入：5.06億元。(115年再編列2.15億元)
目前辦理情形	1.新市水資中心（含再生水廠）用地查估作業(已於114.03完成)，並於114年4、5月份完成第1、2次土地所有權人公聽會及協議價購價格審查會議。另已於114.06.25、09.02辦理協議價購會議，其中台糖公司已協議完成。 2.水資中心及再生水廠促參案工作說明書、勞務契約及預算書編製，預計於114年10月底函報國土署。

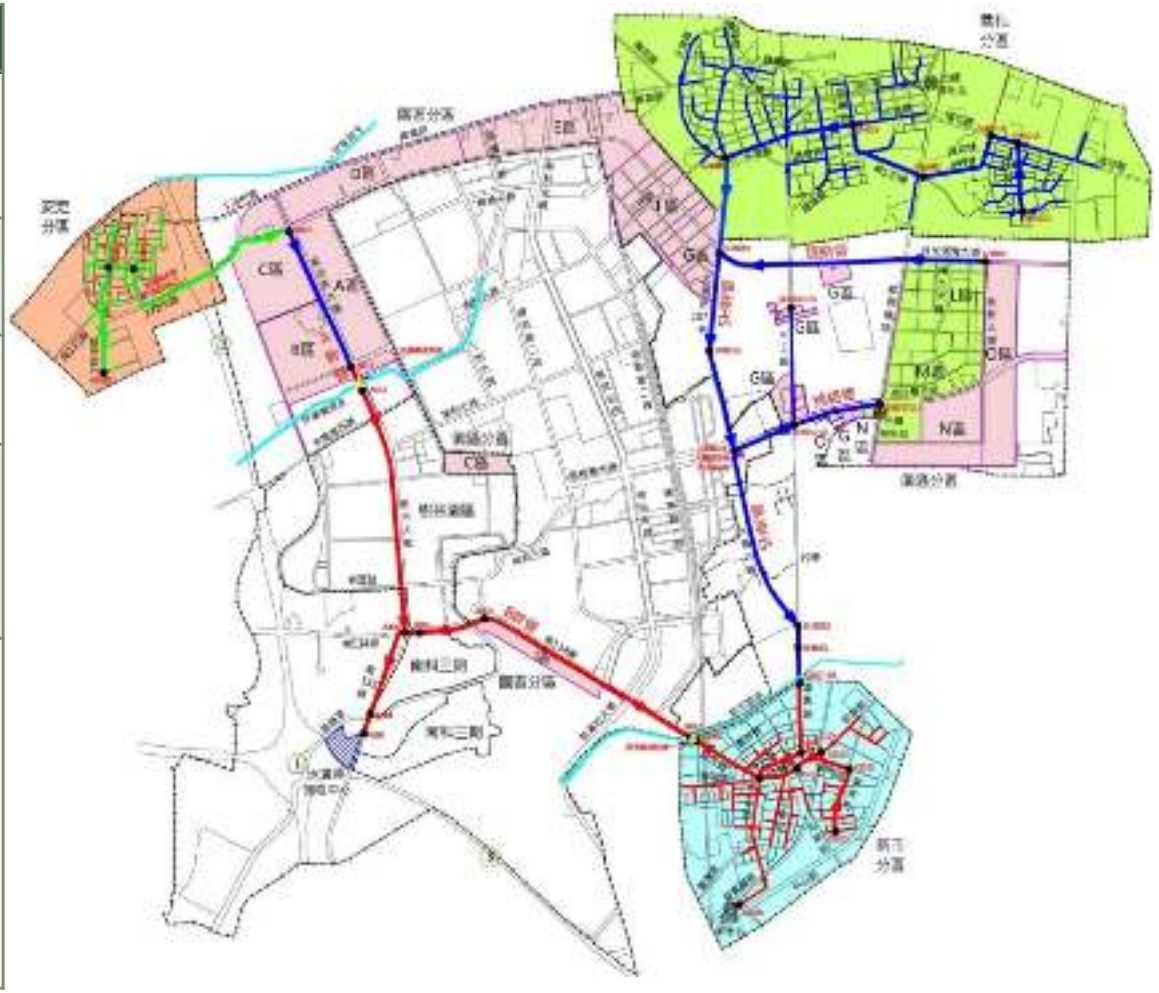

項次	案名	115年編列經費(千元)	總經費(千元)
1	臺南市新市水資源回收中心用地取得費用	210,323	794,575
2	新市水資源回收中心放流水回收再利用先期規劃委託履約管理技術服務	5,000	73,623
合計		215,323	868,198



臺南市議會第 4 屆第 6 次定期會提案

類別	工務	編號	7	提案單位	臺南市政府（水利局）	中華民國 114 年 10 月 17 日 府水工字第 1141433450 號
案由	經濟部核定本市「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第 11 批次防洪綜合治理工程工作計畫，經費 2 億 3,349 萬 6,000 元整(全額中央補助)，因應中央函文補助案件增加，114 年度應增加編列經費 1,167 萬 5,000 元(全額中央補助)，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俾憑辦理後續相關作業事宜，俟 115 年度追加減預算時辦理轉正，敬請審議。					
說明	一、依據經濟部 114 年 10 月 3 日經授水字第 11460018880 號函辦理。 二、本案符合「各機關單位預算執行要點」第 44 點第 4 款，經上級政府核定之補助款所使用之支出。 三、本案為經濟部補助本市辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第11批次治理工程等 4 案，總經費 2 億 3,349 萬 6,000 元整(全額中央補助)，因應中央函文補助案件增加，114 年度應增加編列經費1,167 萬5,000 元(全額中央補助)，因未及納入本府 115 年度總預算案，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俾憑辦理後續相關作業事宜，俟 115 年度追加減預算時辦理轉正。 四、本案業經本府 114 年 10 月 14 第 719 次市政會議審議通過。 五、提送墊付款案緊急性理由：經濟部已同意核定治理工程，並要求限期內完成招標作業，倘未完成者將研議取消，故於本會期提出墊付案申請。					
辦法	請貴會同意先行辦理墊付，俟115年度追加減預算時辦理轉正。					
