客家委員會113年度客庄創生環境營造計畫

專案審查核定結果彙整表

	核定案名	申請單位	核定結果	補助項目	本會核定額度（萬元）
1	臺南市客家文化會館性別友善空間規劃設計暨工程施作案	臺南市政府客家事務委員會	修正計畫書後同意補助	規劃設計暨工程施作類	676.2
合計				**676.2**	

客家委員會客庄創生環境營造計畫
修正計劃書

113年度

計畫名稱：臺南市客家文化會館性別友善空間規劃設計暨工程施作案

□調查研究類
□地方輔導團類
□駐地工作站類
□先期評估規劃類
□規劃設計類
■規劃設計暨工程施作類
□工程施作類

計畫編號：

執 行 期 程 ：自113年9月至114年12月止
主 管 機 關 ：臺南市政府
申 請 單 位 ：臺南市政府客家事務委員會
管理維護單位：臺南市政府客家事務委員會

申 請 日 期 ： 中 華 民 國 113 年 9 月 3 日

臺南市客家文化會館性別友善空間規劃設計暨工程施作案
基本資料表

計畫編號	
主管機關	臺南市政府
申請單位	臺南市政府客家事務委員會
管理單位	臺南市政府客家事務委員會
執行期間	自民國113年9月起至114年12月止
規劃期間	自民國113年11月起至114年2月止
工程期間	自民國114年4月起至114年12月止
實施範圍	1. 臺南市客家文化會館(地址：臺南市南區夏林路4號) 2. 臺南市南瀛客家文化會館(地址：臺南市新營區民權路96之27號)
計畫目標	為改善並營造本市兩客家文化會館舒適、優質與性別友善的使用環境，故辦理本次廁間整修工程實施計畫，透過施作工程，除改善廁間機能外，同時也透過環境改善，創造出性別友善的使用環境。對於本館使用族群多為年齡層偏高的長者而言，「安全便利」的環境即是重中之重，然而在原有環境通風不良、地面容易濕滑及台階設計過高的廁間，使用上相當不便利且不安全，故透過本次的改善整建工程，整體性的達到設備老舊損壞更新、排水管線新配、通風與採光不良改善等情形嚴重的廁間更新計畫。
工作項目	廁間改善工程： 1.天花板、通風及照明設備更新 2.管路設備更新 3.給排水衛生設備更新 4.浴廁用品更新 5.部分牆面、地坪更新 6.門窗扇更新 7.搗擺及隔屏更新 8.標示牌更新

<table>
<tr><td>計畫效益</td><td colspan="5">1.提供使用者乾淨舒適的廁間：對於設備老舊損壞、排水管線阻塞、通風與採光不良等情形嚴重的廁所將優先改善。
2.改善本館各層老舊廁間，維護中高齡使用者身心健康，並因應社會時代變遷，持續朝安全樸實、健康友善、永續環保的方向邁進。
3.透過配合客家會館其他部分設備更新及整建，分階段提升全棟建築使用品質；並加強建築使用週期，打造優質的公共設施使用空間。
4.營造館舍性別友善空間，除讓身障者或行動不便者也能夠輕鬆使用外，更提供跨性別者可自在而不被限制規範進出及使用的友善環境。</td></tr>
<tr><td>計畫總經費
（萬元）</td><td colspan="2">規劃及工程經費</td><td colspan="3">805</td></tr>
<tr><td rowspan="2">經費來源
（萬元）</td><td colspan="2">地方政府自籌款</td><td colspan="2">客委會補助款</td><td>合計</td></tr>
<tr><td colspan="2">128.8(16%)</td><td colspan="2">676.2(84%)</td><td>805(100%)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">地方主管
機關承辦人</td><td rowspan="2">宋○○</td><td>單位</td><td>客家事務委員會</td><td>電話</td><td>06-2991111#8701</td></tr>
<tr><td>職稱</td><td>專員</td><td>傳真</td><td>06-2931703</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td colspan="3">g1930313@mail.tainan.gov.tw</td><td>手機</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">申請單位
承辦人</td><td rowspan="2">劉○○</td><td>單位</td><td>客家事務委員會</td><td>電話</td><td>06-2991111#8629</td></tr>
<tr><td>職稱</td><td>約用人員</td><td>傳真</td><td>06-2931703</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td colspan="3">liu8965@mail.tainan.gov.tw</td><td>手機</td><td></td></tr>
</table>

註：欄位若不敷填寫，請自行調整欄位之寬度與長度，以能確實表達為主。

目　錄

一、計畫緣起……05
二、計畫實施範圍……06
三、現況調查及分析……08
四、計畫範圍現況及執行內容……13
五、執行期程……18
六、經費概算表……19
七、營運管理及維護計畫……20

附錄

1.計畫範圍內土地及建築物所有權證明……1
2.各樓層修復平面圖……5

一、計畫緣起

（一）提案原因

本府依客家委員會112年12月25日客會產字第1126600771號函所示，就轄管之館舍性別友善資源相關情形進行實地盤查。經查，夏林會館一層至四層(包含地下一層)內各層廁間，雖無嚴重損壞處，但建築物啟用至今已逾27年，且有通風不良、地面易濕滑及台階過高等使用缺點，並有多處衛生設備已不堪日常使用；南瀛會館狀況亦同，因原建築體設計及空間限制，該館僅設有兩處廁間可供使用，且無裝置相關多元友善設施(備)。有鑒於此，業依客家委員會113年1月29日客會產字第1136600055號函所示，提送本計畫案，以期進行整體性廁間改善整建工程，重新營造出良好的性別友善空間環境。

（二）計畫目標

1.提供使用者乾淨舒適的廁所使用環境。

2.改善客家文化會館老舊廁所，維護中高齡使用者身心健康。

3.透過配合客家會館其他部分設備更新及整建，並加強建築使用週期，打造優質的公共設施使用空間。

4.營造館舍性別友善空間，除讓身障者或行動不便者也能夠輕鬆使用外，更提供跨性別者可自在而不被限制規範進出及使用的友善環境。

二、計畫實施範圍

（一）臺南市客家文化會館：本館一層至四層(含地下一層)各廁間。

廁所位置	名稱	面積
地下一層	男廁	地坪面積18.4M2
		牆面面積55.74M2
	女廁	地坪面積18.4M2
		牆面面積55.74M2
	左後廁間	地坪面積5.64M2
		牆面面積29.28M2
	右後廁間	地坪面積5.64M2
		牆面面積29.28M2
一層	男廁	地坪面積18.4M2
		牆面面積55.74M2
	女廁	地坪面積18.4M2
		牆面面積55.74M2
	左後廁間	地坪面積5.64M2
		牆面面積29.28M2
	右後廁間	地坪面積5.64M2
		牆面面積29.28M2
二層	男廁	地坪面積18.4M2
		牆面面積55.74M2
	女廁	地坪面積18.4M2
		牆面面積55.74M2
	左後廁間	地坪面積5.64M2
		牆面面積29.28M2

	右後廁間	地坪面積5.64M2
		牆面面積29.28M2
三層	男廁	地坪面積18.4M2
		牆面面積55.74M2
	女廁	地坪面積18.4M2
		牆面面積55.74M2
	左後廁間	地坪面積5.64M2
		牆面面積29.28M2
	右後廁間	地坪面積5.64M2
		牆面面積29.28M2
四層	男廁	地坪面積18.4M2
		牆面面積55.74M2
	女廁	地坪面積18.4M2
		牆面面積55.74M2

（二）臺南市南瀛客家文化會館：本館一層及二層廁間、哺乳室。

一層	無障礙廁間	地坪面積4.01M2
		牆面面積24.09M2
二層	廁間	地坪面積2.53M2
		牆面面積15.33M2
	哺乳室(增設)	地坪面積2.71M2
		牆面面積19.74M2

三、現況調查及分析

（一）臺南市客家文化會館















修復說明


① 損壞原因：衛浴設備老舊、鏡面漏水、空間配置待改善、廁間未符合男女比(1:3)。
修復方式：衛浴設備、泥作地坪、照明空調全面更新，重新規劃內部空間與廁間數量。

② 損壞原因：衛浴設備老舊、鏡面漏水、空間配置待改善，需增設哺集乳室與指標系統。
修復方式：衛浴設備、泥作地坪、照明空調全面更新，重新規劃內部空間與廁間數量。

③ 損壞原因：空間已閒置許久未整理，待重新規畫使用。
修復方式：原有衛浴設備拆除，改作掃具間使用。

④ 損壞原因：空間缺乏茶水間與垃圾桶置於梯間增住通道。
修復方式：增設流理台，垃圾桶與茶水間整合。

二層-空間規劃及配置

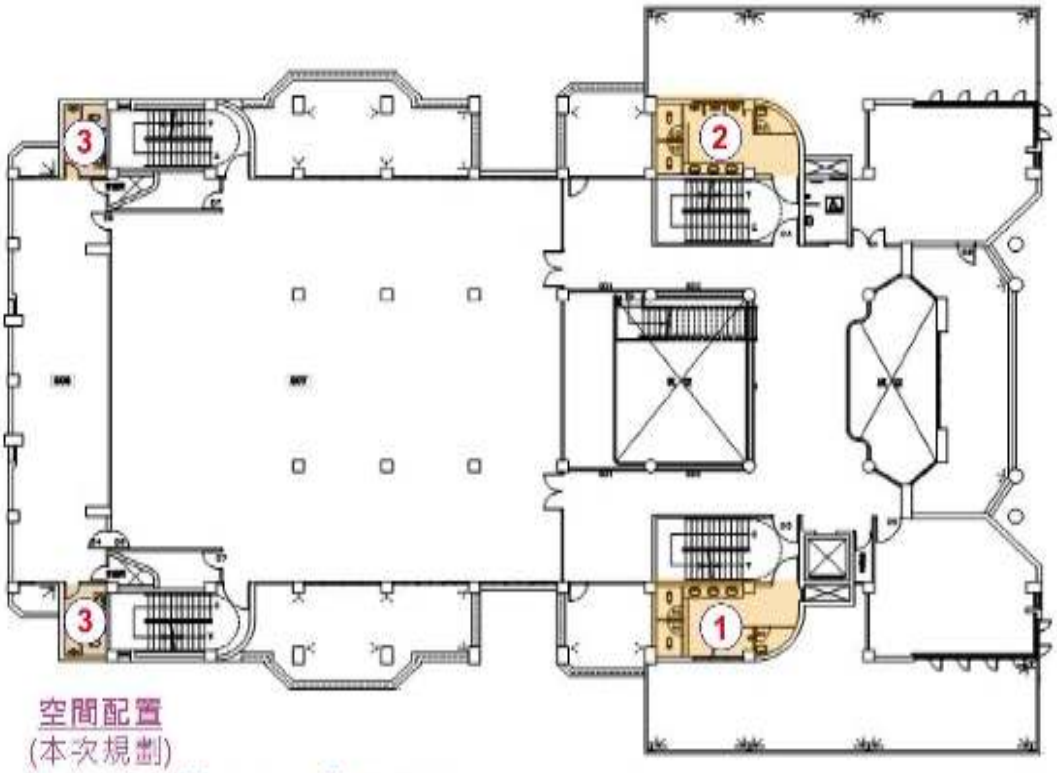

空間配置
(本次規劃)

① 女廁 ② 男廁 ③ 掃具間

二層平面圖


女廁


男廁


掃具間


女廁


男廁

修復說明

① 損壞原因：衛浴設備老舊、牆面漏水、空間配置待改善、廁間未符合男女比(1:3)。
修復方式：衛浴設備、泥作地坪、照明空調全面更新，重新規劃內部空間與廁間數量。

② 損壞原因：衛浴設備老舊、牆面漏水、空間配置待改善，需增設哺集乳室與指標系統。
修復方式：衛浴設備、泥作地坪、照明空調全面更新，重新規劃內部空間與廁間數量。

③ 損壞原因：空間已閒置許久未整理，待重新規畫使用。
修復方式：原有衛浴設備拆除，改作掃具間使用。
