重建進度 3-10 文化資產災損情形及處置情形

文化資產災損57處


國定古蹟：1處

市定古蹟：34處

歷史建築：21處

聚落建築群：1處

- 受損多集中於屋面瓦作、門窗、剪粘等裝飾性灰作，不影響基本功能與結構安全。
- 國定古蹟南門段殘蹟則是受0728豪雨沖刷災損，目前已完成城垣崁腳加固。

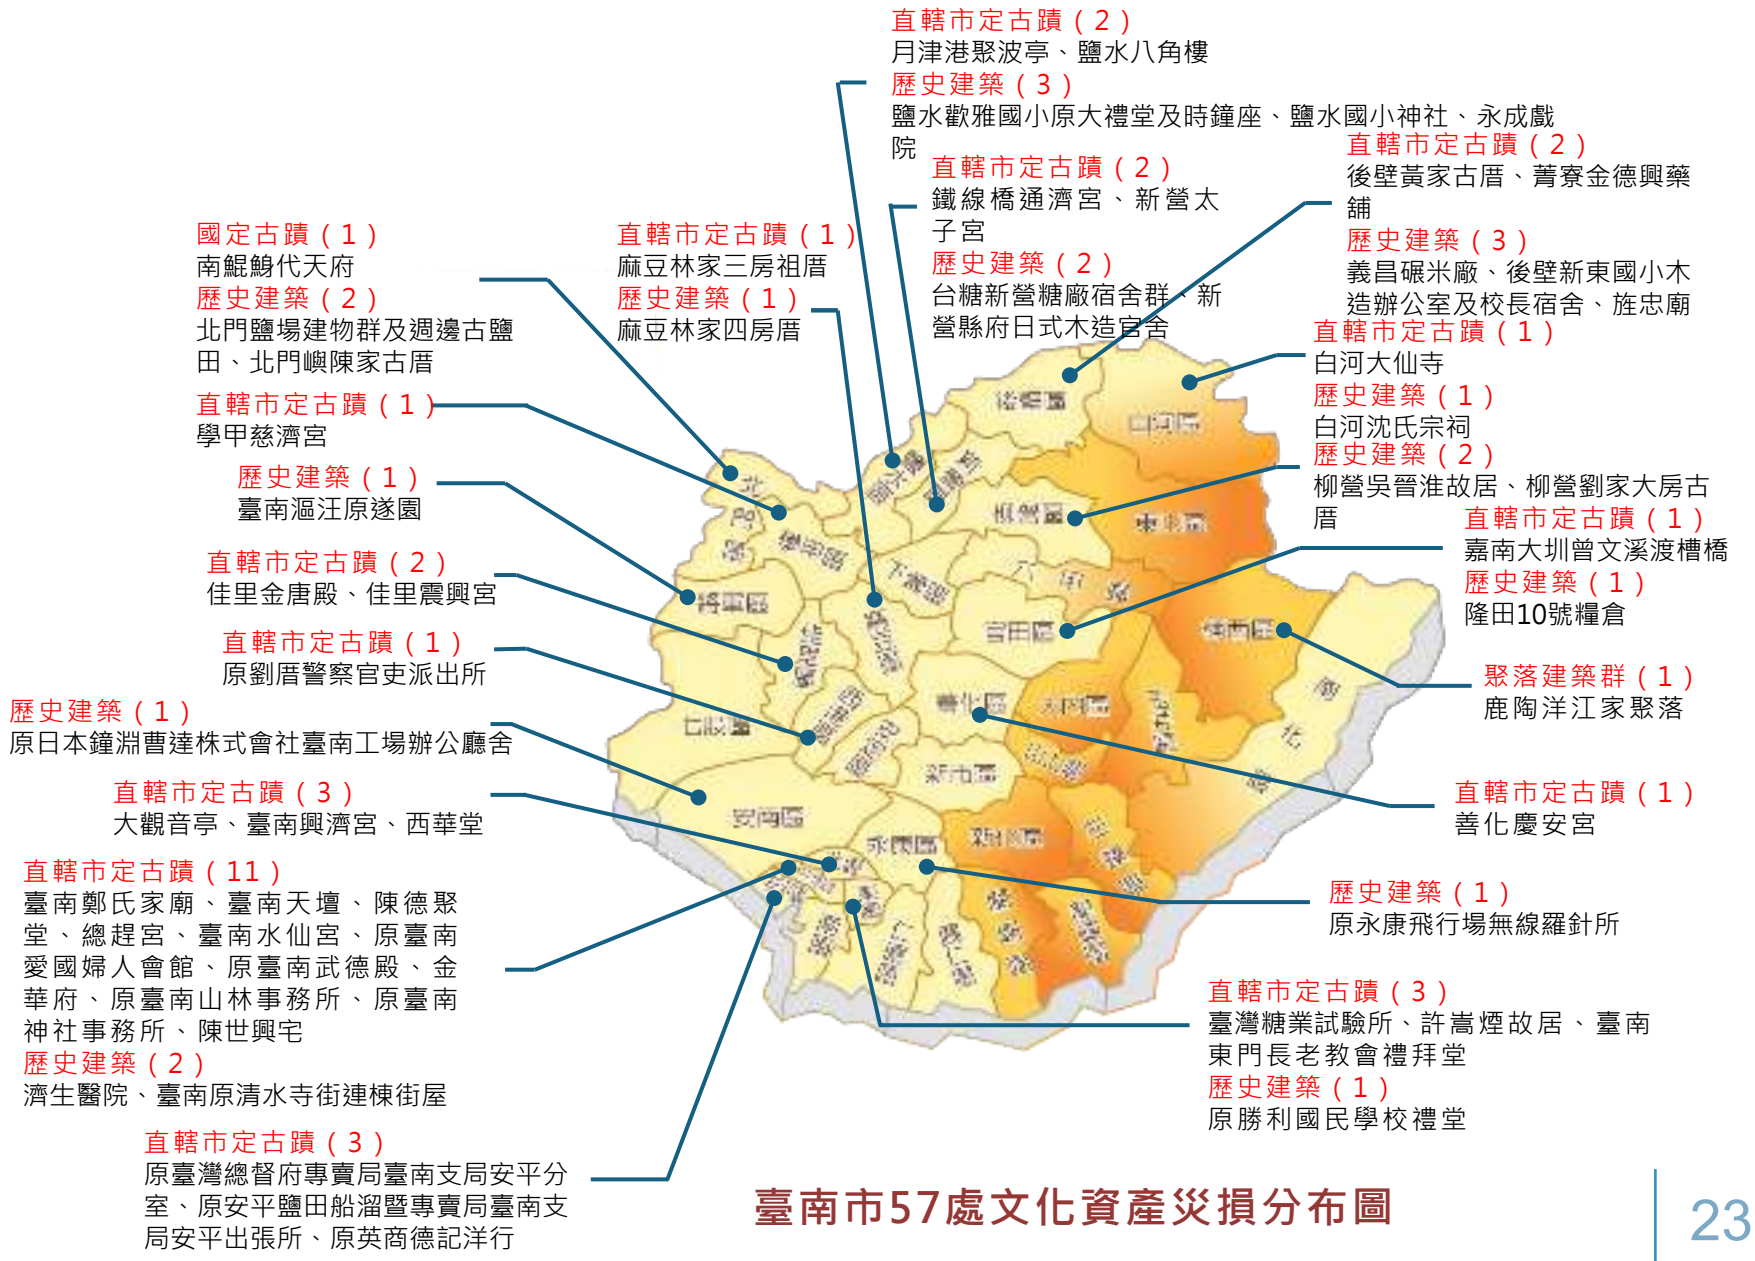

臺南市57處文化資產災損分布圖

重建進度 3-11

文化資產災損修復進度

- 優先爭取本府災害準備金約１,000萬 ，加速災後復建作業流程。
- 修復經費達150萬元以上，同步向中央文化資產局申請補助。
- 爭取特別條例經費挹注約2.3億元。

4

情況較嚴重(損壞規模大)

目前均進行損壞調查設計中

南鯤鯓代天府、北門鹽場建物群及週邊古鹽田、北門嶼陳家古厝、鹽水八角樓

44

情況較單純未涉結構安全

已完成12處

修復中29處

待經費核定3處

9

情況輕微未影響使用

治水防洪 4-1

丹娜絲颱風緊急處置-護岸加高及建立三道防線

- 為七股區西寮聚落防汛安全，緊急加高防洪牆**全長1,000公尺**、高度60公分，**工程於7月17日完成**。

第一道防線

於海巡署的西寮執檢站附近**搭建鋼便橋**，完成**大寮排水破堤緊急搶修**。

第二道防線

7月28日**完成鹽田土堤加高加固**，修復完成後成功積蓄鹽田水量，阻止外水倒灌。

第三道防線

7月25日完成**市道176線路堤加高**作業，避免海水倒灌進入社區。









第1道防線搶修完成



第2道防線土堤加高完成



第3道防線路堤加高完成

治水防洪 4-2

積極爭取經費強化防洪

向中央應爭取47.33億元，已獲經濟部核列4.03億元

- 丹娜絲風災市府提出七股沙洲復育計畫、大寮排水防潮閘門及蓄洪池治理、西寮等社區抽水設備及水路系統改善、大寮排水系統護岸加固整治等，預期將防洪能力全面提升，提報總經費17.6億元。
- 因應0728大豪雨超出設計強度之雨量，後壁地區排水系統整治部分，首要改善分為聚落內水分流改善及菁寮排水整治二大部份，包括菁寮社區內水排水路分流、 菁寮排水從新嘉橋延伸整治至菁寮社區菁長橋，包括4公里河道整治、3座橋梁改建及用地費，總經費約需17.5億元。
- 因應0728大豪雨後續在六塊寮排水系統整治部分，辦理新順橋改建、增設抽水站，滯洪池，改建左岸護岸及堤後排水，總經費約需8.2億元。
- 經濟部已核列2.3億元辦理下洲子抽水站二期新建工程，將會增加9CMS抽水量，及新設排水箱涵；1.73億元設置新吉分洪箱涵工程，最大分洪量達9CMS。







公共設施復建 5-1

丹娜絲颱風及0728豪雨災害

緊急搶救

➢114年度災準金編列17億元，其中0121楠西地震及搶險搶修開口契約等已動支約11.49億元，另丹娜絲颱風及0728豪雨災害「緊急搶救」及「法定天然災害救助」已動支約14.48億元，合計動支約25.97億元，其中不足約8.97億元部分本府已依據「各機關單位預算執行要點」第44條第3款及第45條第1款墊付款支用相關規定辦理墊付完成，並已函文貴會。

災害復建工程

➢本次114年丹娜絲颱風及0728豪雨，臺南市已向中央提報283件，金額約12.27億元，其災害復建工程經費中央會依審核結果全額補助。



丹娜絲颱風鹽水區岸內排水番寮橋下游350公尺處右岸護岸災後復建工程，提報1200萬元



丹娜絲颱風龍崎區楠坑里樹子林野溪災後復建工程，提報1800萬元

公共設施復建 5-2

災害復建工程

- 114年丹娜絲颱風及0728豪雨災後復建工程，依據不同的災害類別，復建工程共計283件，金額約12.27億元，已向中央提報爭取經費補助

機關別	災害類別	複勘後評定災害層級									
		A		B		C		D		合計	
		件數	復建金額	件數	復建金額	件數	復建金額	件數	復建金額	件數	復建金額
水利局	水利工程A1	31	335,095	2	9,836					33	344,931
	水土保持工程G1	7	31,770	13	63,914					20	95,684
工務局	公路系統工程C1	22	104,264							22	104,264
	市區里道路橋梁工程C2	6	17,099							6	17,099
	建築工程(公園)D1	6	16,185							6	16,185
農業局	農路工程H3	25	88,463	69	150,918	0	0			94	239,381
	建築工程D1	0	0	1	3,200	0	0			1	3,200
教育局	學校工程L1	20	58,591	7	26,527					27	85,118
漁港及近海管理所	漁港工程K1	4	92,515							4	92,515
地政局	農地重劃區農水路工程H1	2	17,270	3	10,035					5	27,305
觀光旅遊局	觀光工程Ｂ１			9	43,465					9	43,465
環境保護局	環保工程M1	3	8,000							3	8,000
體育局	學校工程L1			16	83,437					16	83,437
民政局	活動中心D1	2	5,120	3	7,021	4	3,277			9	15,418
文化局	圖書館辦公室建築工程D1					3	19,238			3	19,238
	文化資產工程P1					1	1,087			1	1,087
文資處	文化資產工程P1			3	1,098	1	2,000			4	3,098
	建築工程D1	2	746							2	746
社會局	社區活動中心D1	2	12,565							2	12,565
	公設民營老人福利機構D1			1	1,150					1	1,150
	社會福利服務中心D1							1	250	1	250
警察局	建築工程D1	12	7,801							12	7,801
	文化資產工程P1	1	2,500							1	2,500
都市發展局	文化園區D1	1	2,653							1	2,653
層級依序累計		146	800,637	127	400,601	9	25,602	1	250	283	1,227,090

特別預算 6-1

爭取預算 全力復原

- 「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，係為加速推動復原重建，業經114年8月19日總統令公布，特別預算於8月29日經立法院三讀通過，預算規模新台幣600億元。

- 本府農業局、水利局、工務局、經發局、環保局、交通局、社會局、文化局、消防局等提報計畫，截至9月23日爭取261億9,230萬元。以及本府災防辦向中央爭取丹娜絲颱風專案提報復原緊急搶救經費及復建工程費用共24億元8,463.6萬元，總計爭取286億7,693.6萬元。(截至9月23日環保局獲核定8.12億元、工務局獲核定11.99億元)

特別預算 6-2

爭取本市重要電力幹線地下化工程

提升整體防災效能，確保供電穩定

- 經與台電共同討論，針對本市轄內天然災害常造成配電事故區段、海岸迎風面及影響停電範圍大之配電幹線，且路基良好，無地層下陷區域之路段，納入韌性電網計畫評估
- **經發局於114年9月2日函請台電向經濟部爭取25億7,040萬元預算**，並納入《丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例》預算，**執行安南、南區、北門、鹽水及學甲、關廟、南化、將軍、善化等行政區之電力幹線地下化工程**，提升整體防災效能，降低災害對配電設備線路之損害，確保供電穩定

項次	行政區	工程路段	路段長度(公尺)	工程經費(萬元)
1	安南區	台17線164K~168K(國聖橋南側～北汕尾三路)	4,000	16,800
2	南區	台17線180k+300m~181k+300m(鯤鯓路~喜明街)	1,000	4,200
3	北門區	台17線137K+700~147K+700	20,000	54,150
4	鹽水、學甲區	台19線100K+0~118K+500	37,000	143,250
5	關廟區	台19甲線51K+500~52K+600(保安橋~長文街)	1,100	4,620
6	南化區	台20乙線6K~7K(南化市區)	1,000	4,200
7	將軍區	南21線(南20~南18，滬汪木棉花道)	1,500	6,300
8	善化區	台1線312K+700~318k+300(178線~西拉雅大道)	5,600	23,520

預計爭取經費： 25億7,040萬元

特別預算 6-3

爭取預算 全力復原

丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案爭取經費彙整表			
重建項目	本府局處 /中央對應部會	總申請經費 (億元)	申請計畫
農業設施	農業局 /農業部	5.98	農糧、漁業、畜牧業專案補助輔導措施
電力設施	工務局/經濟部 經發局/能源署	26.701	1.區路轄燈、景觀燈設施設備修復及改善工程 2.**爭取本市重要電力幹線地下化工程**
自來水、天然瓦斯及燃料設施	經發局/經濟部	0.629	辦理災區原水取水、淨水場、加壓站、其他供水設施之損毀修復及災後環境復原計畫
家園及公共設施	工務局/國土署	21.81	1.淹水區域側溝改善計畫(13區) 2.住屋毀損之修繕及拆除費用實施計畫、家園復原慰助金、災後危樓拆除等
	水利局/國土署	49.1	復原重建下水道計畫

特別預算 6-4

爭取預算 全力復原

重建項目	本府局處/中央對應部會	總申請經費(億元)	申請計畫
家園及公共設施	觀旅局/觀光署	1.24	文化觀光旅遊振興提案計畫
	環保局/國土署	6.5601	1.建築物拆除營建混合廢棄物清運及處理計畫 2.磚瓦土石清運計畫
	文化局/文資處	1.7061	有形文化資產災損案件補助計畫
水利設施	工務局/水利署	18.739	新營區延平路與柳營區柳營路跨急水溪橋改建工程等7件
	水利局/水利署	107.13	1.復原重建水利建設計畫 2.復原重建清淤及逕流分攤計畫
道路交通	交通局/公路局	0.2	台南市境內交通設施(號誌、標誌)搶修及韌性強化工程
	工務局/公路局	3.322	市道、區道搶修建計畫-道路邊坡防護案6件及道路排水案-14件
