	
照片 7 祖祠堂壁面單元掉落(左)	照片 8 祖祠堂壁面單元掉落(右)

2、居住單元震損概要

居住單元配置在中軸及外埕兩側，整體可分成東南、東北、西南及西北區。區內各單元屋身之構造方式並不完全一致，有最傳統的竹架、木架、編竹夾泥牆，也有部分後期改為磚牆，但基本風貌上都保持雙斜瓦頂。本次地震主要震損可歸納下列幾種模式：

(1)前後坡屋面屋瓦向下滑動、掉落。

(2)屋面中脊前後屋瓦擾動、破損，由屋內可見天光，下雨時雨水將直接灌入。

(3)壁體外傾變形，與垂直向連結之壁體產生裂隙或與楹仔脫離。

(4)屋面因地震上下作用，導致支撐屋面之楹仔產生明顯撓曲變形。

	
照片 9 屋面屋瓦向下滑動、掉落	照片 10 屋瓦擾動、破損

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>照片 11 屋內可見天光</td><td>照片 12 壁體外傾變形</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>照片 13 壁體與楹仔脫離</td><td>照片 14 楹仔產生明顯撓曲變形</td></tr>
</table>

3、需進行緊急支撐之震損居住單元概述


(1)56 號

本單元西側外牆與所有楹仔脫離，由室內可見天光，若餘震持續，外牆可能面外傾倒，屋面亦可能整個崩落。本單元建議以 C 型鋼架支撐前坡及後坡所有楹仔。




(2)88 號

本單元位於聚落副軸(南-北)之西側，單元之東側外牆有明顯外傾及水平裂隙。




(3)84 號

本單元在聚落外埕之北側，本次地震造成磚砌廊柱破壞，失去支撐屋面之結構基本性能。建議在各廊柱之間以門形框架來緊急支撐。

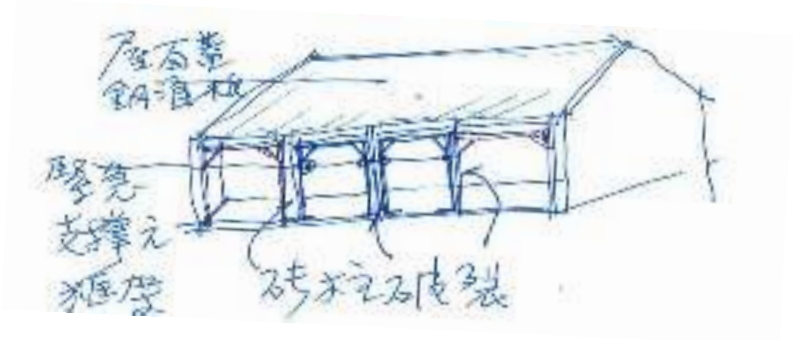

(4)39 號及 39-3 號


此兩單元座落於聚落外埕之南側，兩單元只隔約 90cm 左右之巷弄。兩單元在震後山牆有外傾變形現象。為防餘震造成面外傾倒，建議在相鄰山牆間加水平繫桿，以防止變形持續。

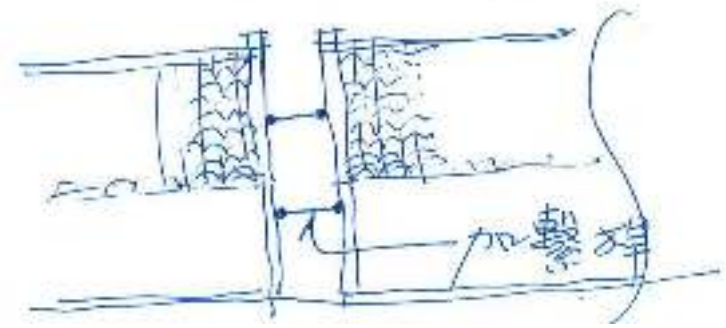

(二)修復原則說明

1、仰合瓦屋頂仿作/整修

目標：恢復仰合瓦屋面，防水毯補強、瓦隴滑落抑止、屋脊及歸帶斷裂補強，因應棟架形式調整工法

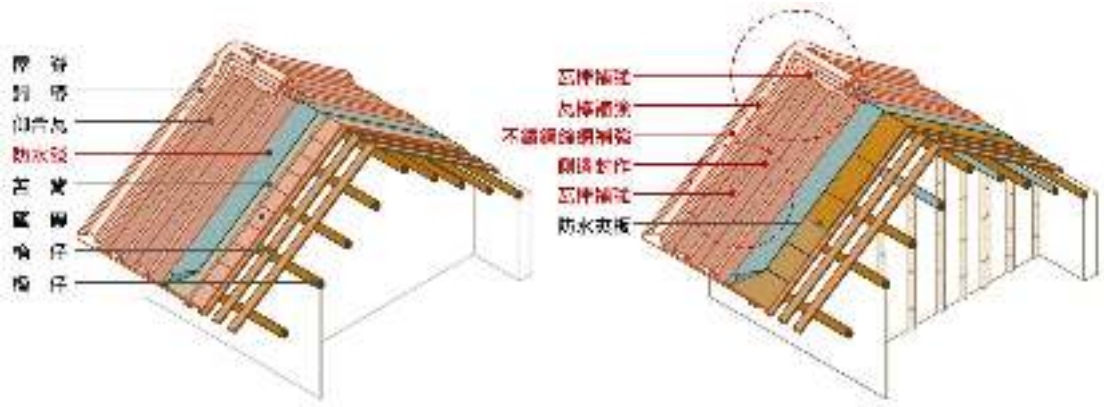

2、磚牆

目標：裂縫修補，結構安全

損壞形式	復建工法
裂縫 D≦0.5cm	無收縮水泥砂漿填補
裂縫 D > 0.5cm	1B磚牆 ➢ 垂直及斜向裂縫以扁形不鏽鋼條補強 ➢ 水平裂縫以不鏽鋼絲網補強(有粉刷層)，無收縮水泥砂漿填補(無粉刷層) ½磚牆 ➢ 不鏽鋼絲網補強(有粉刷層) ➢ 無收縮水泥砂漿填補(無粉刷層)
轉角垂直裂縫	扁形不鏽鋼條補強 C型鋼圈梁或L型鋼板結構補強
員光門	損壞嚴重者以步口磚牆交丁砌築補強 裂縫輕微者不鏽鋼絲網補強(有粉刷層)或無收縮水泥砂漿填補(無粉刷層)

3、土角牆/編竹壁

目標：裂縫修補

損壞形式	復建工法
土塊體損壞	不鏽鋼絲網整面披覆補強(內外側)

損壞形式	復建工法
編竹壁面層開裂	面塗剔除、整堵白灰粉光
編竹壁局部剝落	剝落處底、中塗層仿作、整堵白灰粉光
編竹壁角隅剝落	剝落處底、中塗層仿作並增設玻璃纖維網補強、整堵白灰粉光
編竹壁整堵掉落	整堵仿作、骨材確實嵌入柱中2公分
異材質相接開裂者	

4、棟架

目標：結構安全

損壞形式	復建工法
竹棟架	◆ 棟架橫向變形者，棟架校正，增設門型框架補強 ◆ 正背面牆體腰堵凸出者，增設棟架形框架補強 ◆ 斗拱處榫接施作/校正 ◆ 竹筒柱破裂者，以籐箍補強

5、楹仔

目標：結構安全

損壞形式	復建工法
木楹仔	◆ 木楹仔以原材料整修為原則，經評估需抽換則為之 ◆ 整修以環氧樹脂(Epoxy)+木屑填補
竹楹仔	◆ 竹楹仔以整修為原則 ◆ 經評估損壞嚴重者以鋼管抽換 ➢ 排列以中參竹木楞，依序跳支鋼管為原則 ➢ 鋼管需好接迪結

十、計畫執行之方法與步驟：

(一)前置作業：完成搶修計畫及施作。

(二)修復計畫：由各戶委託建築師事務所進行損壞調查、修復規劃設計監督及施工紀錄。

(三)工程施作。

十一、計畫執行之預定進度(以甘特圖表示)

民國 114 年 3 月至 117 年 3 月

第一批次：

聚落部分：27 棟

年度 / 工作內容	114 年				115 年				116 年				117 年
	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3
規劃設計													
工程施作													
結案請款													

第二批次：

聚落部分：22 棟

年度 / 工作內容	114 年				115 年				116 年				117 年
	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3
規劃設計													
工程施作													
結案請款													

歷史建築部分：護龍 4 棟

年度 / 工作內容	114 年				115 年				116 年				117 年
	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3
規劃設計													
工程施作													
結案請款													

十二、經費預算明細表：

本案配合地方需求，以較緊急或現況有居住者之震損標的優先，分兩批次執行，第一批次(聚落建築群 25 戶 27 棟)**所需總經費為 67,901,134 元**(分年編列)。其中，工程費為 47,875,850 元、間接工程費為 8,781,696 元(包含規劃設計及監督、施工紀錄、空氣污染防制費、工程管理費)、震損現況調查報告書 168,418 元、復建工程影像紀錄 1,500,000 元、工程預備金 9,575,170 元。

(一)歷史建築(江家宗祠)(含規劃設計、監督施工紀錄)：護龍 4 棟

預計 2,500 萬元(其中規劃設計費佔 170 萬、監督施工紀錄佔 300 萬、工程費用佔 2,030 萬元)

(二)聚落部分：49 棟

預計 12,500 萬元(其中規劃設計費佔 830 萬、監督施工紀錄費佔 1,500 萬、工程費用佔 10,170 萬元)

十三、經費來源（含全程計畫所需經費及分年經費需求)：

（一）總預算：150,000,000 元

（二）申請本局補助：75,000,000 元

（三）地方配合款：0 元

（四）所有權人自籌款：0 元

（五）申請其他機關補助(客家委員會)：75,000,000 元

（六）預定分年經費概算需求

年度	分年編列經費 (A=B+C+D)	申請本局補助經費 (B)	地方配合款 (C)	其他財源 (D)	備註 (管理維護類請註明經、資)
114 年	13,000,000	6,500,000	0	6,500,000	資
115 年	60,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
116 年	69,000,000	34,500,000	0	34,500,000	
117 年	8,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
合計	150,000,000	75,000,000	0	75,000,000	

（七）預定申請撥款（補助經費）期程及金額

單位：元

期別	申請撥款期程（年/月）	申請撥款金額	備註
第 1 期	114 年 12 月	6,500,000	
第 2 期	115 年 4 月	10,000,000	
第 3 期	115 年 8 月	10,000,000	
第 4 期	115 年 12 月	10,000,000	
第 5 期	116 年 4 月	12,000,000	
第 6 期	116 年 8 月	12,000,000	
第 7 期	116 年 12 月	10,500,000	
第 8 期	117 年 3 月	4,000,000	
合計		75,000,000	

十四、預期效益：

透過本次修復，除能保障居民生命財產安全，亦能將部分鐵皮屋頂恢復為傳統瓦片，既有空間結構及建築風貌維護，並將閒置屋舍整合改造為招待所及學習、展示空間，環境美學及聚落意象介入空間等。

臺南市議會第4屆第6次定期會

「114年0121地震楠西區鹿陶洋江家古厝震損復建計畫」墊付案(建設市提6號)補充資料

114年1月21日地震，致楠西區歷史建築鹿陶洋江家宗祠及聚落建築群鹿陶洋江家聚落嚴重受損，亟須修復。爰此，本計畫內容係針對江家宗祠及聚落內各棟受損之建築物依文化資產保存法規定辦理損壞調查、規劃設計、緊急加固、整修工程與施工記錄…等相關作業。所需復建總經費共計1.5億元，經爭取後由中央兩部會(文化部及客家委員會)各挹注經費50%(即各挹注7,500萬元)，臺南市文化資產管理處進行輔導，江家祭祀公業協助聚落內各受災戶辦理發包簽約與復建事宜。

本計畫預計9月底開工，並以較緊急或現況有居住者為優先執行標的(計25戶)，該部分預計於115年底完成，其餘部分則陸續於117年底前完成。

另查，臺南市客家事務委員會於第4屆第4次定期會提報「臺南原鄉客家聚落青年駐地工作站計畫」墊付案，計畫總經費350萬元，由中央客家委員會補助。該計畫以楠西地區為執行範圍，設置駐地工作站，引入專業團隊導入創生輔導模式，培育當地青年、盤點地方既有「人、文、地、產、景」客家資源、辦理各式客家產業活動等，以活絡地方經濟，造就地方創生。後因應0121地震，進一步輔導地方向中央部會爭取經費，辦理「共享廚房-從災後重建到文化賦權社區」、「再造楠西-以歌聲守護社區」等相關計畫。

綜上，前揭兩案分別由本市文化局及客家事務委員各自推動，彼此間並無直接配合事項。

臺南市議會第 4 屆第 6 次定期會提案

類別	建設	編號	8	提案單位	臺南市政府（勞工局）	中華民國 114 年 9 月 10 日 府勞條字第 1141274630 號
案由	勞動部核定補助本市辦理「114 年度外國人臨時安置」經費新臺幣 67 萬 5,000 元（全額中央補助），為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俾憑辦理後續相關作業事宜，俟 115 年度追加減預算時辦理轉正，敬請審議。					
說明	一、依據勞動部 114 年 8 月 19 日勞動發管字第 1140027888 號函辦理。 二、本案符合「各機關單位預算執行要點」第 44 點第 4 款，經上級政府核定之補助款所使用之支出。 三、本案相關說明：本案預估所需總經費達 197 萬 5,000 元，原編列且核撥的 130 萬元不足支應，不足額 67 萬 5,000 元業經勞動部 114 年 8 月 19 日勞動發管字第 1140027888 號函同意補助在案，因未及納入本府 115 年度總預算案，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俟 115 年度追加減預算時辦理轉正。 四、本案業經本府 114 年 9 月 9 日第 714 次市政會議審議通過。 五、提送墊付款案緊急性理由：外國人臨時安置作業要點旨在保障在臺外國人的基本人權，及遇到困境時能獲得庇護安置及妥善的照顧等多項支援措施。隨著安置人數的增加，導致整體安置費用大幅上升，以致經費出現不足之情形。					
辦法	請貴會同意先行辦理墊付，俟115年度追加減預算時辦理轉正。					
審查意見	聯席審查意見：同意墊付。					
大會決議	照聯席審查意見同意墊付。					
