112年度南化區小崙里自來水公司睦鄰補助路面劣損預拌混凝土維護改善

第二次修正計畫書

一、計畫緣由：

由於經濟部水利署與台灣自來水公司之南化水庫及關埔頂淨水廠等座落南化區境內，近年來因風災後進行一系列陸上清淤及水庫抽泥工程，除因大型運輸車承載大量砂土來往造成道路破損及塵沙彌漫影響居民生活外，水庫抽泥之放流水常有堵塞下游農民灌溉用抽水馬達，進而影響農民農作及農業生產，故陳請台灣自來水股份有限公司於進行施作一系列影響居民之工程時，應本著敦親睦鄰的精神，適當提撥經費補助605m^{3}混凝土回饋地方。

二、計畫概要：

(1)路面改善

平穩的村里道農路面提供民眾通行及農作便利安全，改善維護路面為民眾引頸企盼之期望。

(2)施設位置

維持路面平整於小崙里轄內計約21處路面，其平均寬度約2m、2.2m、2.5m、3m、3.5m、4m，厚度約0.12m，總長度約1980m之路面維護改善，合計需預拌混凝土605m^3。

三、計畫期程：本計畫預定工作進度自 112 年 10 月 1 日至 113 年 12 月 31 日完成。

期間(年月)	112 年	113 年
工作項目	10 月	12 月
辦理財物採購招標		
預拌混凝土		

備註：工作項目為最初提報計畫之預定項目，實際會依核定金額及現況辦理調整增刪。

四、所需經費：

新台幣 1,331,000 元整(605m^3*單價$2,200=1,331,000 元)。

南化區公所

財務預算表

工程名稱:112年度南化區小崙里自來水公司專業補助路面劣損預拌混凝土維護改善

工程地點:小崙里


工程項目名稱及說明		單位	數量	單價	總價	備註
壹	發包工作費					
1	140kg/cm2 預拌混凝土(運至工地)	m3	605.00	2,200.00	1,331,000	
	合計				1,331,000	

所需預拌混凝土共計605m3

序號	申請人	長度(m)	均寬(m)	厚度(m)	方數(m3)		地名	GPS (TWD97)	備註
					路面(m3)	其他(m 3)			
1	王國洲	100	4	0.12	20.0		大鏡	起點：X197876 Y:2550734	
2	王金塗	100	3.5	0.12	42.0		山尾寮	起點X:195010 Y:2550352	
3	尤景亮	80	3	0.12	30.0		後壁湖	起點X:199134 Y:2550969	
4	尤忠立	40	2	0.12	10.0		後壁湖	起點X :199130 Y:2550969	
5	呂永安	60	2.2	0.12	16.0		內坑	起點X :199269 Y:2550582	
6	呂永安	150	2.2	0.12	40.0		六丘	起點X:198935 Y:2551357	
7	呂有修	80	2.2	0.12	22.0		大貢山	起點X:199055 Y:2550942	
8	力榮福	90	2.2	0.12	25.0		後壁湖	起點X:198962 Y:2550995	
9	戴清平	100	3	0.12	36.0		水口	起點X:195815 Y:2550498	
10	呂忠佑	50	2.5	0.12	15.0		湘仔埔	起點X:196552 Y:2551438	
11	何木輝	70	3	0.12	26.0		湖底口	起點X:198307 Y:2549554	
12	王秋鄰	220	2.5	0.12	66.0		田中央	起點X:198687 Y:2549721	
13	呂文煌	100	3	0.12	36.0		關埔坑	起點X:199633 Y:2550667	
14	呂世榮	60	2	0.12	15		二坎	起點X:199231 Y:2550824	
15	張明輝	100	2.5	0.12	30.0		崎腳	起點X :198589 Y:2551147	
16	張正融	150	2.5	0.12	45.0		坎腳下	起點X :198550 Y:2550826	
17	林秋能	100	2.2	0.12	27.0		內坑	起點X:198034 Y:2550102	
18	尤忠立	60	2.5	0.12	18.0		埤內	起點X:198270 Y:2550603	
19	張明輝	100	2.2	0.12	27.0		芒籠	起點X:198820 Y:2551098	
20	力榮林	120	3	0.12	44.0		大貢山	起點X:199007 Y:2550572	
21	陳榮昌	50	2.5	0.12	15.0		石坑	起點X:199779 Y:2550190	
		1980		方數(m3)	605.0				



1. 大鏡　起點(197876, 2550734) 20m （申請人:王國洲）

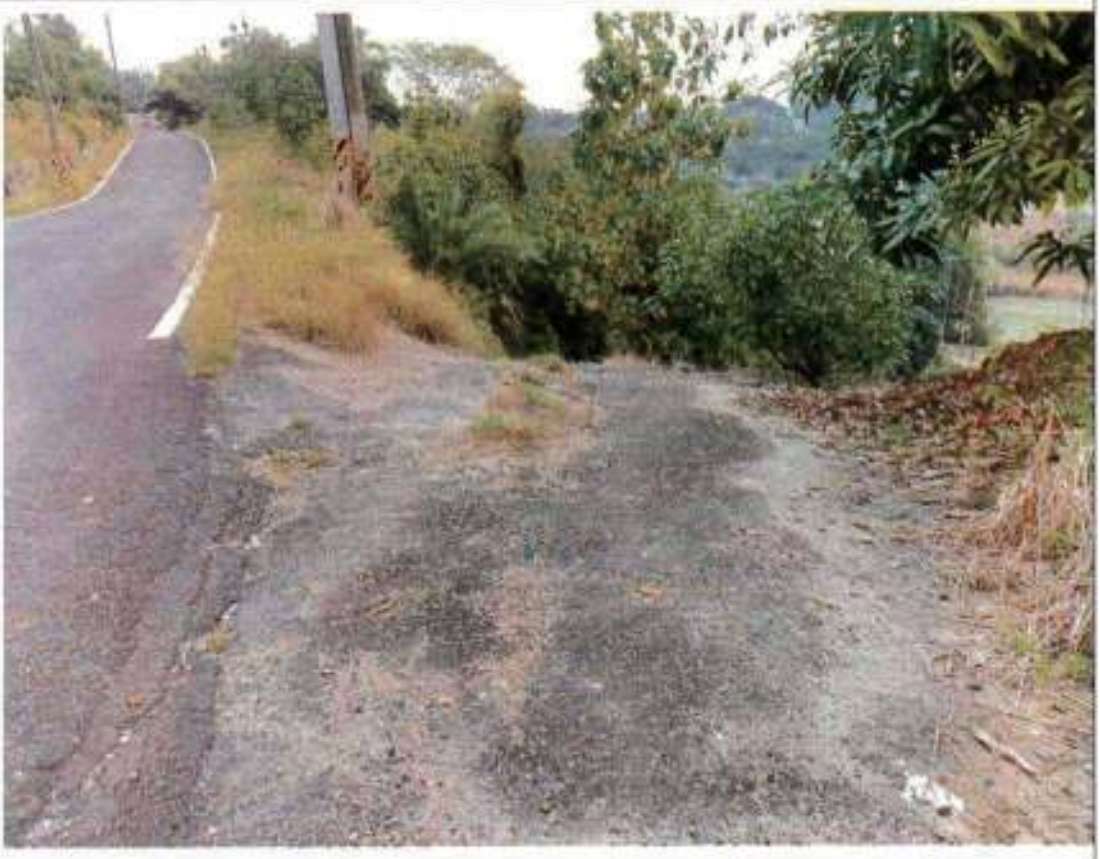

2. 山尾寮 起點(195010, 2550352) 42m （申請人:王金塗）



3. 後壁湖 起點(199134, 2550969) 30m （申請人:尤景亮）



4. 後壁湖 起點(199130, 2550969) 10m （申請人:尤忠立）



5. 內坑 起點(199269, 2550582) 16m （申請人:呂永安）



6. 六丘 起點(198935, 2551357) 40m （申請人:呂永安）



7. 大貢山 起點(199055, 2550942) 22m （申請人:呂有修）



8. 後壁湖 起點(198962, 2550995) 25m （申請人:力榮福）



9. 水口 起點(195815, 2550498) 36m （申請人:戴清平）



10. 湘仔埔 起點(196552, 2551438) 15m （申請人:呂忠佑）



11. 湖底口 起點(198307, 2549554) 26m （申請人:何木輝）



12. 田中央 起點(198687, 2549721) 66m （申請人:王秋霖）
