臺南 TAINAN

臺南岸內影視基地
Tainan Anei Film Studio

112-113 年臺南市岸內糖廠影視基地發展計畫



申請單位：臺南市政府文化局

文化部「推動地方影視音發展計畫」

計畫提要表

<table>
<tr><td>計畫名稱</td><td colspan="6">112-113 年臺南市岸內糖廠影視基地發展計畫</td></tr>
<tr><td rowspan="5">主辦單位</td><td>名稱</td><td colspan="5">臺南市政府文化局文創發展科</td></tr>
<tr><td>地址</td><td colspan="5">臺南市中西區府前路一段 197 號</td></tr>
<tr><td rowspan="3">聯絡人</td><td>姓名</td><td>林谷靜</td><td>職稱</td><td colspan="2">專案人員</td></tr>
<tr><td>電話</td><td colspan="4">06-2149510#16</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td colspan="4">kuching24@mail.tainan.gov.tw</td></tr>
<tr><td>實施期程</td><td colspan="6">自核定日起至 113 年 11 月 30 日</td></tr>
<tr><td>計畫經費</td><td>總經費</td><td>1 億 5,714 萬 2,000 元</td><td>補助款</td><td>1 億 1,000 萬元</td><td>配合款</td><td>4,714 萬 2,000 元</td></tr>
</table>

目　錄

第一章、　計畫緣起與目標 1

一、 計畫緣起 1

二、 目標與發展願景 1

第二章、　執行內容規劃 2

一、 影視製作區-倉庫群修復工程 2

二、 時代場景建設 4

三、 基礎建設 9

四、 時代場景租借 17

第三章、　基地營運規劃 18

一、 促參案規劃 18

二、 岸內糖廠影視基地各項工程位置與分期圖 19

第四章、　計畫期程及經費概算 20

一、 期程規劃(依計畫核定日調整) 20

二、 經費概算表 22

第一章、 計畫緣起與目標

一、 計畫緣起

本計畫係延續「臺南市岸內糖廠影視基地發展計畫」第一期(107-109 年)，該計畫獲「文化部補助直轄市及縣（市）政府推動地方影視音體驗及聚落發展計畫」補助 1.2 億元，含本府自籌款共投入 2.4 億元；第二期(110 年)獲文化部補助 6,300 萬元，含本府自籌款共投入 9,000 萬元及第三期（111 年）獲文化部補助 8610 萬元，含自籌款共投入 1.23 億元，以岸內糖廠為影視及文創產業發展基地，將閒置多年之糖廠土地及建物重新再利用，於園區內打造臺灣歷史時代拍片場景，並建置完善硬體空間。

二、 目標與發展願景

本計畫以岸內糖廠為中心，全區位於平原帶，可用空間廣大、天際線乾淨遼闊，具影視拍片發展潛力。經再利用原有糖產業文化遺產場域，結合影視產業軟硬體設施、在地文化特色，轉型成為兼具影視拍片、文化教育與休閒遊憩功能之影視基地，該基地將以推動臺灣各年代歷史場景搭建為主要特色，引入影視拍攝製作相關設備以及片廠專業營運管理團隊資源，期藉此計畫之執行，整合在地特色資源，推動臺灣影視產業發展。



第二章、 執行內容規劃

一、 影視製作區-倉庫群修復工程

(一)紅 1 倉庫變更設計

岸內糖廠影視基地紅 1 倉庫修復工程刻正進行中，其中工程進行中發現相關工項有許多隱蔽部分於原規劃設計階段尚無法知悉之處，及為配合後續影視之需求需新增相關工項，故在本次變更設計中併以新增。

紅 1 倉庫為配合未來作相關攝影棚使用，爰新增廁所(含無障礙廁所)、茶水間及淋浴設備與汙水處理設備，以利未來影視人員相關需求，本項工程工項包含隔間結構工程、防水工程、室內裝修工程、衛生設備工程及汙水處理設施等工程。

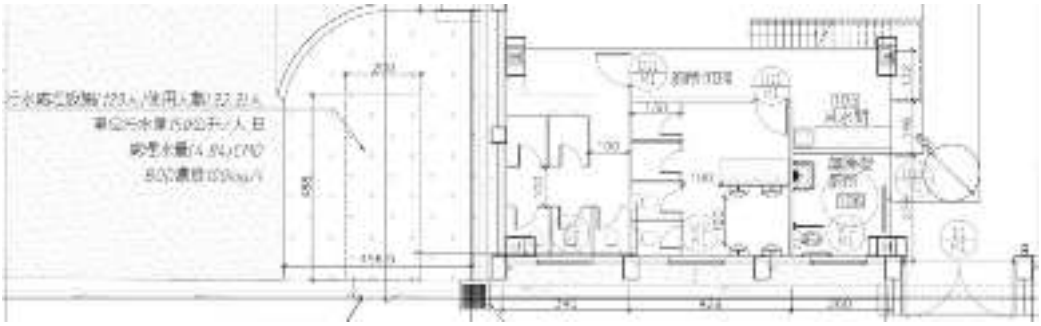


圖 2-1 紅 1 廁所立面圖

紅 1 倉庫相關隱蔽部分需辦理變更設計增加工項則包含屋架修復工程、內牆面修復工程；屋架修復增加隱蔽部位之原芬克式金屬屋架修復、及木桁條因結構及與屋架接合面等問題更改為 C 型鋼桁條；內牆修復新增則以隱蔽部位之內牆面破損及裂縫修復。另新增與園區變電站連接電線電纜之工程。

(二)紅 3 倉庫修復工程

為滿足服務影視產業後場工作機能需求，提供影視產業劇組工作人員於岸內影視基地進行場景搭建、道具製作及存放等工作使用空間，爰委託國內具有片場建置經驗之專業廠商協助建置工作坊。

工作坊以基地內既有閒置空間活化方式辦理，現階段規劃以基地內閒置空間 R3 及 R4 倉庫建物為使用標的，整修作為工作坊空間。

製景工作坊建置計畫分二階段辦理，第一階段 111 年度優先完成後場製景工作坊(R3 及 R4 倉庫)所需空間規劃配置，以及完成 R4 木工坊美術組辦公室空間建置及啟用營運。

R3 油漆及道具庫房之建置事宜，定於 112 年辦理。依採購法第 22 條第一款第七項規定，配合岸內影視基地內建築整建計畫之延續性需求，納入「岸內影視基地製景工作坊建置及執行」案後續擴充採購，階段性完成工作空間建置事宜。

表 2-1. 製景工作坊使用空間基本資料

名稱編號	原用途類別/啟用年月	建物面積㎡	規模構造/建號	未來用途
R4	肥料倉庫 (28 年 6 月啟用)	538.85 (163 坪)	一層磚造、局部 RC 增建、木構造屋架	木工坊、美術辦公室

112/07/19 文化部李靜慧次長視察木工坊進度





名稱編號	原用途類別/啟用年月	建物面積㎡	規模構造/建號	未來用途
R3	物料倉庫 (54 年 4 月啟用)	384.99 (116.14 坪)	一層磚造、金屬屋架	油漆庫房、道具倉庫

二、 時代場景建設

(一)日治時期至戰後初期時代場景建置-場景搭建第一期

為瞭解影視產業界對於時代場景之具體需求，臺南市政府於112 年委託專業團隊辦理「日治時期至戰後初期場景美術設計」案，經由前期研究田調，分析臺灣近年時代影視作品場景使用需求，以及影視產業界專業人士訪談後，確立未來日治時期場景建設發展需求。

綜觀臺灣近二十年拍攝時代影劇的場景建置，多為服務單一項目的獨立搭景，且幾乎拍攝完成後即拆除，或因工法於外景難以保存，長期缺乏以一座影城為單位的整體規劃。

臺灣曾有可供專業影劇團隊拍攝的製片廠，但時代變遷使然，目前臺灣可供拍攝的外景影城尚待建立。

從臺灣近年時代影視作品中可看出，在臺灣歷史四個時期裡，具有高度重複性的場景類型，這些場景代表在臺灣戲劇拍攝上有一定的使用需求，另外也可觀察到某些場景在當代仍可能取得。從臺灣歷史脈絡來看，其中充滿了豐富的故事，這些都可能成為重要的劇本種子，也可能因此部分反映出該時代場景的需求。

由執行團隊提供的影視產業現況、需求與建議，可印證臺灣確實有建置時代影城的需求，且年代大約為日治時期至戰後初期，最具可擴充性、延展性。臺灣從日治時期至戰後初期的都市樣貌與建築形式多元且複雜，從時間軸來看，臺灣歷經多個

政權更替，在這塊土地上留有豐富的建築式樣。日本開始治理臺灣後，受到明治維新全盤西化的影響，日本統治者也將新的都市建築觀念與技法引進臺灣，將舊有的城牆、城門拆除，加上設置現代行政部門與各種不同功能的新建築。同時，臺灣也成為日本內地的建築師大展身手的舞臺，臺灣的建築風格因此有明顯轉變。臺灣各級政府機關幾乎都採西方式樣為主，都市樣貌也以西方都市模式為主。

從空間軸來看，臺灣的戲劇故事經常發生在街道或重要建築內外，例如根據從事影像相關業界訪談者所說，在發展日治時期故事時，所需要的中小型街道時代外景，反而難以取得。臺灣的時代外景目前缺乏繁華的主街，以及主街上具有標誌性的大型建築，例如車站、郵局、銀行等，或是中型、小型的商店街、廣場與圓環，幾棟或單獨一棟的民宅。這樣的街廓樣貌與建築形式，對於中小型預算的劇組而言，無論要建置或借取都很困難，期望能在岸內基地時代場景區，為中小型預算劇組預先建好適用的時代場景，以機能可劃分為官（火車站、郵便局）、商（百貨公司、市場）、民的建築，配合大、中、小型的街廓與巷弄。

而對於製作預算達億元規模的劇組，製作團隊建議，除應優先完成時代場景基礎及結構，以供劇組搭景、陳設、改景使用外。時代場景區外的土地，應先進行整地提供搭景用空地，彈性因應大型劇組搭建外景之需求。

「日治時期至戰後初期場景美術設計」案場景設計範圍佔地約 5 公頃，臺南市政府於 112 年 4 月 10 日邀集產學界專家審查結果，均認同場景建設契合產業界所需，並應考量分區分階段完成建設，逐步落實，作為未來開發臺灣歷史文化相關影視作品，延伸推廣創意產業內容之基礎。

延續 112 年度完成之日治時期至戰後初期場景美術設計成果，本計畫擬採分區分階段場景搭建，落實基地固定式時代場景建設之整體感及完整性外，亦可優先滿足劇組拍攝計畫及影視相關產業拍攝需求，提供上線使用。

日治時期場景建設計分 5 階段進行，第一階段配合 112 年已赴岸內影視基地完成勘景，確認拍攝計畫之潛在劇組拍攝時程，優先完成場景美術 B、C 區(大街、牌樓厝)部分端景場景基礎結構搭建，接續延伸日治時期商業大街場景為(112~113 年)階段目標。

第一階段搭建計畫執行經費如有餘額，將持續辦理全區(大街、牌樓厝、木造街屋、廣場)基礎及水電配管為主。後期各階段執行規劃：第二階段辦理 B 區(大街)場景建物搭建，目標完成 B 區(大街)街道；第三階段辦理 A 區(廣場)場景建物搭建；第四階段辦理 C 區(牌樓厝) 場景建物搭建；第五階段辦理 D 區(木造街屋) 場景建物搭建。

綜上所述，如能依上述階段，依序建置完成時代場景區內建物搭建，可合理期望岸內基地將能提供大、中、小場景，與跨時代的各式場景型態。

茲因，場景搭建將採分區分階段建設，故場景藝術質感之維持及全區景觀之完整性為品質管制重點。因此，市府**將成立「場景搭建技術顧問團隊」辦理專案管理角色，協助辦理場景設計施工方面之審查、監督及品質控管，以維繫場景建設之施工性、藝術性及技術可行性**。另配合時代場景之延伸發展，妥適考量不同時期完成場景之基礎設施銜接及景觀縫合介面處理，以符合公共建設永續經營，整體營運可行性之需。

圖 2-2 日治時期至戰後初期場景 A～D 區範圍

